

FICHA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

ESTRATEGIA “MEJORAS INTEGRALES”

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
“NAPO GALERAS”

PROYECTO APOYO A LA REFORMA EDUCATIVA EN
LOS CIRCUITOS FOCALIZADOS

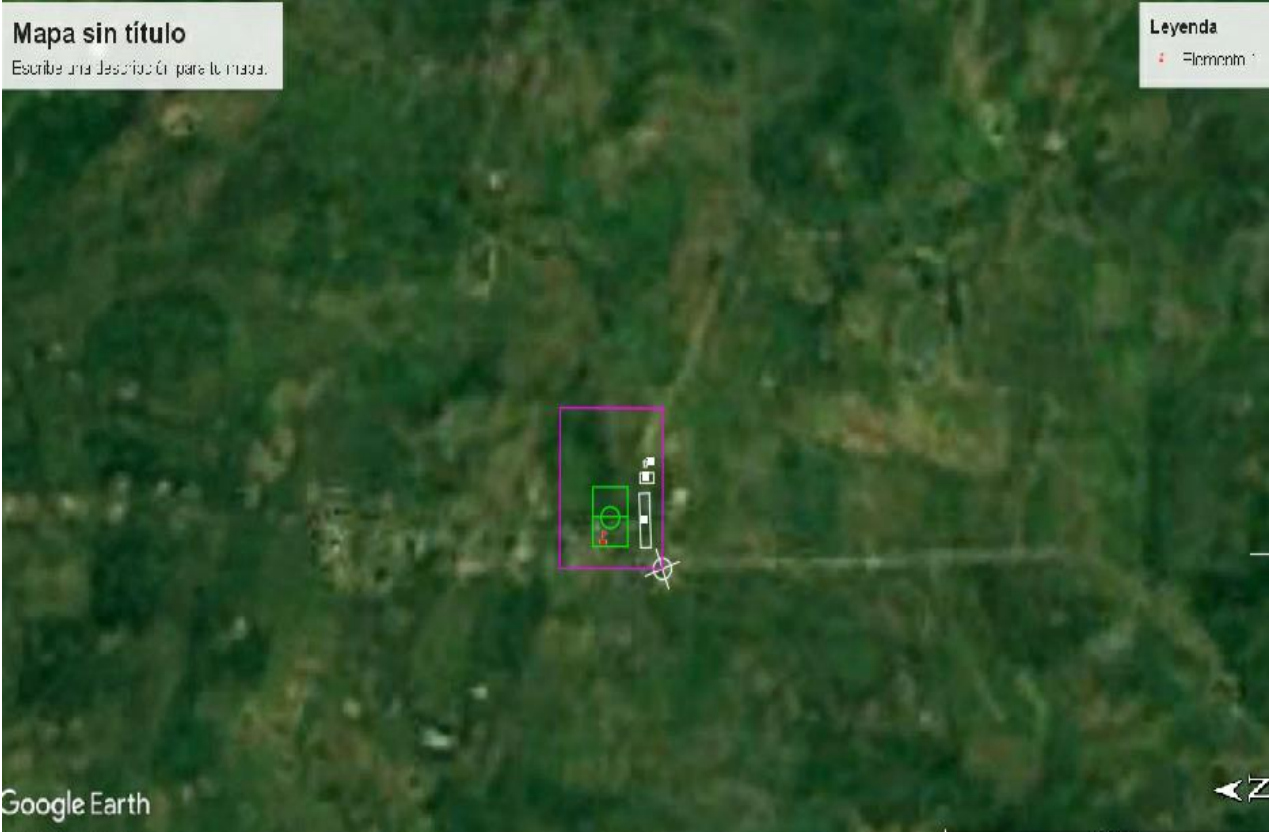
PARECF
BIRF 8542-EC

2022

ÍNDICE

1.	FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO.....	3
2.	MARCO LEGAL REFERENCIAL.....	5
2.1.	Políticas Operacionales del Banco Mundial	5
2.2.	Marco Legal Ambiental y Social Nacional.....	6
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD	7
4.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN.....	10
4.1.	Componente Físico.....	11
4.2.	Componente Biótico.....	11
4.3.	Componente Socio Económico.....	12
5.	PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	13
6.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS).....	15
6.1.	Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.....	16
6.2.	Plan de Manejo de Desechos	18
6.3.	Plan de Comunicación y Capacitación.....	21
6.4.	Plan de Gestión Social	22
6.5.	Plan de Contingencias	24
6.6.	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.....	25
6.7.	Plan de Monitoreo y Seguimiento.....	26
6.8.	Plan de Cierre, Abandono y Entrega	27
6.9.	CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	28
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31
8.	FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.....	31
9.	ANEXOS DE LA FICHA AMBIENTAL	31

1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

CÓDIGO CIU	DESCRIPCIÓN CÓDIGO CIU						
F4100.20	Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas , edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes						
DATOS GENERALES UNIDAD EDUCATIVA							
Sistema de coordenadas UTM WGS84, (Zona 17 Sur) Centroides de los proyectos, obras o actividades:	X	666650,097	Y	9875497,899	Altitud (msnm)	71	
Estado del proyecto, obra o actividad							
Mantenimiento:	X	Operación:	X	Cierre:		Abandono:	
Dirección:	Recinto Bella Sombra, entrada al Guabito, vía Mocache Pichilingue						
Cantón:	Mocache	Sector:	Recinto Bella Sombra	Provincia:	Los Ríos		
Parroquia:	Mocache		Zona no delimitada:		Periférico:		
Urbana:							
Rural:	X						
Datos del Promotor:	Ministerio de Educación						
Domicilio del Promotor:	Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa						
Correo electrónico del Promotor:	juanp.villafuerte@educacion.gob.ec		Teléfonos:	2-396-1300			
CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA							
Área del proyecto (m ²):	1000 aproximado	Infraestructura (residencia, industrial, u otros):			Educativa		
Mapa de ubicación							
<p>Mapa sin título</p> <p>Escribe una descripción para tu mapa.</p>							
<p>Google Earth</p>		<p>Legenda</p> <p>Elemento</p>					

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES			
FASE DE CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO			
1 volqueta	1 cargadora	1 retroexcavadora	
1 concretara	1 vibrador de hormigón	1 cortadora	
1 soldadora portátil	1 compresor	20 andamios metálicos	
herramienta menor			
FASE DE OPERACIÓN			
Sistemas eléctricos		Equipos informáticos	Sistemas de iluminación
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA			
<ul style="list-style-type: none"> • Agregados pétreos, piedra bola. • Cemento portland, yeso, cementina. • Aditivos de hormigón, plastificantes. • Agua. • Tuberías de cemento, PVC, hierro galvanizado, manguera plástica. • Bloques, ladrillos, mampostería. • Acero de refuerzo en varillas diferentes diámetros, planchas de tol en diferentes espesores, platinas, clavos, tornillos, bisagras, cerraduras, puertas y ventanas de aluminio, pasamanos metálicos. • Hormigón, morteros, emporador. • Polietileno, mallas plásticas, geomembranas, material de impermeabilización. • Malla electrosoldada, • Recubrimientos, azulejos, barrederas, gres. • Piso flotante, baldosas, lijas. • Pintura epóxica, banda impermeabilizante, pintura látex, pintura de caucho, esmalte, pintura de cubiertas, laca, thinner. • Maderas: tableros, alfajías, pingos, pisos, madera y tableros de encofrados, puertas, tapamarcos, muebles. • Vidrios. • Galvalumen, cubierta metálica, panel termo acústico (tipo sanduche). • Medidor, tuberías y accesorios de PVC presión para agua potable en diferentes diámetros. • Muebles sanitarios como inodoros, urinarios y accesorios. • Tuberías y accesorios de PVC para alcantarillado varios diámetros. • Breakers, cableado, tomacorrientes, interruptores, accesorios de instalaciones eléctricas, de voz y datos. • Implementos y accesorios de control de incendios como: extintores, detectores de humo, alarmas. 			
REQUERIMIENTO DEL PERSONAL.			
<p>La cantidad y tipo de personal que se requiere en obra, dependerá de las actividades que se desarrollen y el tiempo de ejecución, entre los principales tenemos: maestros mayores, operadores de equipo pesado y/o liviano, albañiles, fierreros, electricistas, carpinteros, pintores, plomeros, ayudantes y peones.</p> <p>Personal técnico mínimo será:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superintendente. • residente de obra. • técnicos especialistas según las ingenierías que se ejecuten. • 1 técnico en seguridad industrial, salud y ambiente. <p>Personal de apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bodeguero. • 1 logística. 			
ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO			
Área Total (m ²):	1000 aproximado		Área de Implantación (m ²): 1000 aproximado
Agua Potable:	SI (X)	NO (X)	Se obtiene agua a través de un pozo.

Energía Eléctrica:	SI (X)	NO ()	Red pública			
Acceso Vehicular:	SI (X)	NO ()	Facilidades de transporte para acceso:		Ingreso de vehículos livianos y pesados	
Topografía del terreno:	Regular		Tipo de Vía:		Caminos vecinales	
Alcantarillado:	SI ()	NO (X)	Telefonía:	Móvil (X)	Fija ()	Otros (Internet)
Observaciones: Las aguas grises y negras se van a un pozo séptico						

SITUACIÓN DEL PREDIO			
Propio:	X	Alquiler:	N/A
Comunitarias:	N/A	Zonas restringidas:	N/A
Otros (Detallar):	N/A		
Observaciones:	La unidad educativa cuenta con escrituras del predio.		

2. MARCO LEGAL REFERENCIAL

La estrategia de mejoras integrales y reaperturas, está financiado por el Banco Mundial, por lo tanto, es imprescindible cumplir con las directrices emitidas por esta entidad internacional, en ese sentido, se busca ampliamente el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales establecidas por el Banco Mundial, así como también el cumplimiento de la normativa ambiental, social y de seguridad y salud ocupacional nacional.

Una pieza fundamental del trabajo de la institución en proyectos de inversión es el de ayudar a asegurar resguardos muy sólidos para las personas y el medio ambiente a través de políticas, llamadas “salvaguardas”, que sirven para identificar, evitar y minimizar el daño a las personas y el medio ambiente.

2.1. Políticas Operacionales del Banco Mundial

Las Políticas Operacional Ambientales y Sociales de Banco Mundial vigentes a la firma del Contrato de Préstamo BIRF 8542-EC y que se activan para el Proyecto PARECF que financia la estrategia de mejoras integrales y reaperturas de las unidades educativas son las que se presentan a continuación:

Tabla Nro. 1: POLÍTICAS OPERACIONALES DEL BANCO MUNDIAL

POLÍCAS OPERACIONALES Y PROCEDIMIENTOS DE BM	MANUAL OPERATIVO PARECF
4.01 Evaluación Ambiental	Anexo V.4: Marco de Gestión Ambiental Y Social (MGAS)
4.11 Patrimonio Cultural y Físico	
4.10 Pueblos Indígenas	Anexo V.5: Marco de Planificación Pueblos Indígenas
4.12 Reasentamientos Involuntarios	Anexo V.6: Marco de Políticas de Reasentamiento
17.5 BP Divulgación al público	Anexos V: 1,4, 5, 6.

La estrategia de mejoras integrales y reaperturas al ser financiada por el Proyecto PARECF con fondos del Banco Mundial, razón por la cual es de obligatorio cumplimiento las salvaguardas ambientales y sociales de esta entidad (ver Anexo 1. El proyecto de acuerdo a la categorización del BM, es clasificado como Categoría B de acuerdo a la política operacional sobre Evaluación Ambiental (OP 4.01), esto implica que los impactos ambientales que podrían ser generados son reversibles y mitigables. Las políticas operacionales ambientales del BM que se activan para este tipo de proyectos, son:

- Evaluación Ambiental (OP 4.01);
- Recursos Culturales Físicos (OP 4.11).

Al respecto de la política operacional OP 4.11, esta no se activa debido a que la infraestructura de la “Escuela de Educación Básica Napo Galeras” no se encuentra dentro del catálogo de edificios patrimoniales, pero si durante los trabajos se encuentra algún vestigio arqueológico se detendrán los trabajos y se notificará a la autoridad competente.

En conformidad con el MAGAS (Marco de Gestión Ambiental y Social), para la OP4.01, relacionada con evaluación ambiental, las actividades del proyecto tendrán un impacto positivo, en el mediano y largo plazo; dentro del proceso de mejora de la calidad educativa, su correcta distribución y cobertura, además de la dotación de infraestructura educativa de primer nivel. En el corto plazo se generarán impactos ambientales negativos, no necesariamente irreversibles; para los cuales en la mayoría de los casos se pueden adoptar medidas de mitigación, que compensan las repercusiones adversas y mejoran el desempeño del proyecto desde el punto ambiental.

Por tanto, el instrumento para la aplicación de la salvaguarda es la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental y Social especificado dentro del presente documento, además se obtiene la respectiva autorización ambiental emitida por el MAATE.

2.2. Marco Legal Ambiental y Social Nacional

Para la ejecución de la estrategia de mejoras integrales y reaperturas, se ha considerado la normativa nacional vigente a la fecha, a continuación, se presenta un breve resumen:

Tabla Nro. 2: MARCO LEGAL AMBIENTAL Y SOCIAL

MARCO LEGAL AMBIENTAL Y SOCIAL	
Constitución de la República del Ecuador	
Codificada y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, vigente a partir de su publicación en el Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008. Principios fundamentales relativos al Medio Ambiente y la participación social y de los pueblos indígenas.	Artículos: 1, 3, 14, 15, 21, 26, 16, 35, 39, 43, 45, 47, 57, 61, 66, 72, 73, 83, 85, 92, 95, 96, 97, 204, 208, 227, 319, 320, 321, 325, 326, 327, 341, 344, 347, 395, 397, 398, 424, 425.
Ley de Patrimonio Cultural.	
Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 465 del 19 de noviembre del 2004.	Art. 7, 30.
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)	
Publicada en el Registro Oficial N° 417 del 31 de marzo de 2011.	Art. 1, 2 (o, p, t), 5, 15, 25, 33.
Reglamento General a La LOEI	
Publicada en el Registro Oficial N° 754 del 26 de julio de 2012.	
El Convenio 169	
De la Organización Internacional del Trabajo.	Art. 6.
Código Orgánico del Ambiente (COA)	
Art. 1, 2, 10, 11, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 184, 185, 199, 200, 201, 226,	
Reglamento del Código Orgánico del Ambiente	Art. 1, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 428, 429, 435.
Acuerdo Ministerial N° 013	
(Reforma Acuerdo Ministerial N°109, con fecha 14 de febrero de 2019), Reforma varios artículos del Acuerdo Ministerial N°109, con especial énfasis en el detalle extendido de los procesos de participación ciudadana.	
Acuerdo Ministerial N°109	
(Reforma Acuerdo Ministerial N°061, con fecha 02 de octubre del 2018), Reforma varios artículos del Acuerdo Ministerial N°061, mediante el cual se expide reformas al Libro VI del Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	Art. 7, 12. 13. 14. 27. 28. 34. 39. 44. 45. 46. 247. 248.
Acuerdo Ministerial 026	
Publicado en el R.O. No 334 del 12 de mayo de 2008, este acuerdo fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las actividades potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el MAATE	Art. 1, 2, 3.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo	
(09 de agosto de 2000) Disposiciones que tienen por objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.	Art. 11. 13. 176.
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios	
De 02 de abril de 2009.	Art. 1. 2. 29. 11 54 30.
Norma INEN 3864.- Símbolos Gráficos, Colores Y Señales de Seguridad	
Consiste en las siguientes partes, bajo el título general Símbolos Gráficos – Colores de seguridad y señales de seguridad:	Parte 1: Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad Parte 2: Principios de diseño para etiquetas de seguridad para productos Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad Parte 4: Propiedades colorimétricas y fotométricas de materiales para señales de seguridad
Norma INEN 0731.- Extintores Portátiles y Estacionarios Contra Incendios	
Norma INEN 2266.- Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos	
Norma INEN 2288.- Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución	

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD

Los espacios de aprendizaje son áreas que permiten el crecimiento del ser humano, fortaleciendo su identidad, valorando su entorno natural y social, contribuyendo a su vez, al ciclo económico de su comunidad, con la que mantiene constante relación. Estos espacios deben ser especialmente atendidos por las autoridades y la comunidad para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Convertir a la institución educativa en un lugar que garantice la inclusión y desarrollo de habilidades sociales y culturales de la comunidad educativa. A ello responde el énfasis de estos últimos años en la inversión sostenida para el mejoramiento de la infraestructura educativa.

No obstante, la falta de planificación y directrices adecuadas en el control y proyección de tareas de mantenimiento y limpieza, en los planteles educativos, para responder al alto nivel de ocupación de los espacios escolares y condiciones adversas de índole natural, han resultado en su rápido deterioro.

Para la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, se debe entender que la “Mejora Integral” no se trata de un mantenimiento que se realiza de manera recurrente, su finalidad, es intervenir de manera integral en las instituciones educativas, dejándolas totalmente funcionales y operativas y la estrategia de “Reapertura”, se trata del proceso de intervención de infraestructura física existente, para mejorar el funcionamiento de una institución educativa cerrada o fusionada anteriormente.

Con lo antes expuesto, el Proyecto Apoyo a la Reforma Educativa de los Circuitos Focalizados “PARECF” BIRF 8542-EC financiará la estrategia de Mejoras Integrales y Reaperturas, con 31 unidades educativas que se encuentre dentro de las parroquias priorizadas por la intervención por el proyecto, de esta manera se busca mejorar la calidad y la cobertura con equidad en los niveles inicial, básica y bachillerato del sistema educativo, en el marco de los objetivos estratégicos institucionales del Ministerio de Educación y del Plan Creación Oportunidades 2021-2025

La Escuela de Educación Básica Napo Galeras, se encuentra en la provincia de Los Ríos, parroquia Mocache, cantón Mocache de la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Educación, la dirección de ubicación es El Recinto Bell Sombra, entrada al Guabito, vía Mocache – Pichilingue; la tipología de la unidad educativa es Unidocente y tiene aproximadamente 30 estudiantes.

Esta unidad educativa está formada por los siguientes bloques:

- 1 aula
- 1 comedor
- 1 área de sanitarios
- 1 área externa cubierta
- 1 área de patios y canchas de uso múltiple

Luego de las inspecciones realizadas por los técnicos de la Administración Escolar de la Dirección Distrital 12D03 Mocache – Quevedo del MINEDUC se verificó el estado actual de la infraestructura de la unidad y se determinó que por la falta de mantenimiento se deben realizar los siguientes trabajos:

- Implementación de biodigestor
- Resanamiento de mampostería
- Empaste de mampostería
- Pintura de infraestructura
- Reemplazo de puertas
- Implementación de puntos de luz
- Mejoramiento de la cancha
- Implementación de arcos metálicos
- Implementación de rejillas para dren en el piso de la cancha
- Pintura de la cancha
- Enlucido de superficies

Los trabajos de mejoras continua en la Escuela de Educación Básica Napo Galeras, tomarán aproximadamente 2 meses de ejecución.

Tabla 3 Descripción del proceso

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
Remoción de cobertura vegetal, excavaciones y/o movimiento de tierra	Afectación potencial sobre recursos culturales físicos (estructuras precolombinas, edificios históricos, artefactos, entre otros)	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de desechos sólidos provenientes de los procesos constructivos (desechos de escombros, chatarra, cemento, madera, entre otros)	Contaminación del suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de efluentes provenientes de las actividades diarias en el lugar de la construcción	Contaminación al agua	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación del suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y ruido debido a las actividades del proceso constructivo	Contaminación al aire	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Contaminación acústica	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Emisión de gases debido a la operación de la maquinaria	Contaminación al aire	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Accidentes laborales	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Derrame de combustibles	Contaminación al suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de residuos comunes (papel, plástico, cartón, vidrio) debido a las actividades constructivas	Contaminación del suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del suelo	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
	Alteración paisajística	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas

TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES			
ASPECTOS AMBIENTALES	IMPACTO AMBIENTAL	POSITIVO/ NEGATIVO	ETAPA DEL PROYECTO
	Afectación a la salud	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de material particulado y gases de combustión	Contaminación del aire	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de ruido y polvo	Afectación a la salud	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Generación de residuos sólidos	Afectación a la salud	Negativo	Operación
Reciclaje de desechos	Reducción de desechos	Positivo	Operación
Generación de aguas residuales	Contaminación del agua	Negativo	Operación
Riesgo de accidentes	Afectación a la salud de los estudiantes y profesores	Negativo	Operación
Generación de escombros debido al derrocamiento de las instalaciones	Contaminación del suelo	Negativo	Cierre y abandono
	Contaminación del aire	Negativo	Cierre y abandono
	Contaminación acústica	Negativo	Cierre y abandono
	Afectación a la salud de los trabajadores	Negativo	Cierre y abandono

TABLA DE TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES			
ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Participación y divulgación de información	Conflictos sociales por desconocimiento del proyecto a realizarse.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones prediales menores: actualización de escrituras por rectificación de linderos, por regulación de uso de espacio público o privado.	Negativo	Preparación
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la población aledaña por contaminación del aire, agua o suelo por material particulado y otros.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestias a la comunidad por la afectación al tráfico local y/o seguridad vial de la ciudadanía en general por falta de señalización y coordinación en actividades de desalojo o ingreso del material.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectaciones a la infraestructura colindante (casas, locales comerciales, infraestructura pública, incluye la presencia de árboles colindantes y otros).	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Molestia a la comunidad por afectaciones a los sistemas de agua, riego, alcantarillado y otros servicios públicos en funcionamiento, incluido los accesos que utilizan para su desplazamiento.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Conflictos sociales por afectación al proceso educativo por contaminación acústica, remoción de cobertura vegetal (proyectos escolares de huertos), insuficiencia de espacios recreativos y deportivos.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de riesgo de accidentes o conflictos sociales en la población aledaña por desconocimiento de los Código de Convivencia y Código de Conducta correspondientes a la institución educativa y a la constructora respectivamente.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas

TABLA DE TABLA DE POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES			
ASPECTO SOCIAL	IMPACTO IDENTIFICADO	POSITIVO /NEGATIVO	ETAPA
Salud y Seguridad de la comunidad	Generación de espacios sólidos, llenos de escombros o insuficiente seguridad en el perímetro de la construcción.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Incremento de experiencias de aprendizaje por aprovechamiento de material auditivo, visual y kinestésico diverso, por parte de la comunidad educativa.	Positivo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Afectación a las actividades diarias de las personas con discapacidad por interrupción en los accesos que utilizan para su desplazamiento, ocasionados por la actividad constructiva.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Salud y Seguridad de la comunidad	Dinamización de la economía local por contratación de la mano de obra local y activación del comercio local.	Positivo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos sociales por inconformidad en las condiciones contractuales de mano de obra, expectativas locales sobre contratación de materiales/ maquinaria o por discriminación de género, generacional o discapacidad o falta de comunicación.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Conflictos entre trabajadores y empresa constructora y/o fiscalizadora por temas labores como, por ejemplo: contratación de menores de edad, discriminación en contratación de obreros, explotación por horarios extendidos de trabajo en la obra, subempleo por salarios bajos, etc.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Malestar de la población aledaña y ciudadanos en general por comportamiento inadecuado del personal de obra.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Trabajo y condiciones laborales	Acondicionamiento de espacios adecuados para alimentación, higiene y vivienda en la obra.	Positivo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario	Afectación a los actores sociales, por acceso a servicios básicos, sitios de compras, de prácticas religiosas u otras, como producto de las actividades constructivas.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Pueblos Indígenas	Interrupción en prácticas religiosas, cultural u otras que practiquen las comunidades indígenas como parte de su cultural, producto de las actividades constructivas.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas
Patrimonio cultural	Afectación o pérdida en el patrimonio cultural como consecuencia de las actividades constructivas.	Negativo	Mejoramientos y/o Reaperturas

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN

Datos generales

El proyecto se ubica en el cantón Mocache en la provincia de Los Ríos, de la región Costa del territorio ecuatoriano.

Los principales aspectos del cantón son:

- Fecha de creación del cantón: 24 de mayo de 1996
- Población proyectada al 2025: 48.212 Hab.

- Extensión: 567,96 km²
- Límites:

Norte: Cantón Quevedo- Prov. de Los Ríos
Sur: Cantones Ventanas y Vinces – Prov. de Los Ríos
Este: Cantones Quevedo y Ventanas Prov. de los Ríos
Oeste: Cantones Palenque, Prov. de Los Ríos; El Empalme y Balzar, Provincia del Guayas.

4.1. Componente Físico

Clima

Según la clasificación de Pourrut (1995), el clima se ubica en dos categorías: Tropical Megatermico semi-húmedo cubriendo la mayor extensión del cantón y Megatérmico lluvioso.

Temperatura

El cantón tiene temperaturas que varían entre los 24°C y los 26°C, según el promedio anual.

Precipitación

La precipitación media anual del cantón Mocache oscila, entre 1500 y 2500 mm.

Hidrografía

El cantón Mocache pertenece a la cuenca del río Guayas, subcuencas: río Macul, Vinces y Babahoyo; microcuencas: río Macul y Lechugal, esteros Guarumal, Peñafiel, Las Saibas, Abras de Mantequilla y Drenajes Menores.

Geología y geomorfología

La clasificación Geológica del cantón Mocache se encuentra, en el período cuaternario, con formación Pichilingue, con Litología Terrazas, Sedimentos Fluviales y Arcillas Marinas de Estuario, este último ubicado donde atraviesa el río Quevedo de Norte a Sur.

4.2. Componente Biótico

Flora

Según la clasificación de Holdridge, el cantón presenta dos zonas de vida, la primera es el Bosque Húmedo Tropical, estos tipos de bosque tienen una precipitación anual de 2000 a 4000 mm, en donde la precipitación supera a la evapotranspiración y la temperatura supera los 24°C, en el cantón ocupa toda la mayor parte del territorio a excepción del norte y pequeños tramos del oeste, y el Bosque Seco Tropical, este tipo de bosque está localizado en toda la franja oeste y que inicia desde el Norte y termina al Sur del cantón, y presenta una precipitación de 1000 a 2000 mm, en donde la evapotranspiración supera la precipitación y su temperatura supera los 24°C.

Formación Vegetal

Para la determinación de la formación vegetal se ha tomado los criterios establecidos por Sierra (1999), en el cantón existe una la formación vegetal “Bosque siempreverde de tierras bajas de la Costa”, este tipo de bosques presentan un dosel de más de 30 m y predominan las especies de las familias: Arecaceae, Moraceae, Meliaceae, Lauraceae y Leguminosae. En el territorio este tipo de vegetación está desapareciendo por la expansión de la frontera agrícola, utilizando los suelos para cultivos de ciclo corto y pastos introducidos. En cuanto a estructura del bosque, entre las especies se tiene: Laurel, Caracolí, Bantano, Jigua, Sangre de gallina, Cedro, Guitarro, Amarillo, Naranja de monte, Fernán Sánchez, Veldaco, Por otro lado debido a su poca cobertura basal, se trata de un bosque intervenido.

Fauna

La mastofauna característica del cantón de acuerdo a la clasificación de Albuja et. al. (1980), pertenece al Piso Zoogeográfico Trópico Occidental, que se ubica desde 0 msnm hasta los 1000 msnm, ocupado mayormente por bosques tropicales con precipitaciones que alcanzan los 2500 mm. Las especies registradas en este piso pueden estar o no presentes en el territorio, debido a las importantes alteraciones de los mismos.

Diversidad de mamíferos

La fauna silvestre en el cantón se encuentra en proceso de disminución, debido a la desaparición de los hábitats a causa de la deforestación, uso de agroquímicos y otras acciones que provoca que se reduzcan sus posibilidades de

sobrevivencia. Cabe indicar que la reducción de la fauna silvestre, crea condiciones para el rompimiento en la Cadena Trófica (Alimenticia).

4.3. Componente Socio Económico

Población cantonal

Para el análisis demográfico se utilizó como fuente la información del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC, en el año 2010 y de acuerdo a estos datos el cantón Mocache, tiene una población de 38.392 habitantes, de los cuales 19.996 son hombres que equivale al 52.08% y 18.396 mujeres, que significa el 47.92%. El resultado de la proyección poblacional hasta el año 2025 es de 48.212 habitantes.

Vivienda

El cantón Mocache en su territorio tiene 11516 viviendas según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, de las cuales el 19.91% están ubicadas en la zona urbana y el 80.09% están en la zona rural. Las viviendas en el Cantón Mocache tienen las siguientes características: el 76.98% son casa/villa, el 13.93% son rancho, departamento tenemos el 2.77%, covacha y choza sumados son el 3.81%.

Identidad cultural

La Constitución del Ecuador define a nuestro país como un estado intercultural y plurinacional, con lo cual se busca afianzar la diversidad cultural. En el caso del cantón Mocache el 72.52% se identifican como Montubios, el 22.05% se definen como mestizos y las demás culturas tienen un reconocimiento pequeño.

Acceso al agua potable

En cuanto a la conexión de agua apenas el 26.11% de las viviendas del cantón están conectadas por tubería dentro de la vivienda, el 21.04 tienen conexión de agua fuera de la vivienda, el 46.18% no tiene agua por tubería, reciben agua por otros medios, que son pozos de agua.

Alcantarillado

En el cantón apenas el 7.26% tiene alcantarillado conectado red pública siendo las viviendas que se encuentran principalmente en el centro cantonal. En cuanto a las viviendas conectadas a pozo séptico tiene una cobertura del 45.41%, las viviendas que están conectadas a pozo ciego representan el 25% y el 14.69% no tienen ningún sistema de eliminación de excretas y en su mayoría se encuentran en el área rural.

Disposición de la basura

En el cantón existen diferentes formas de disposición de la basura, el 29.86% de las viviendas tienen recolección de la basura mediante carro recolector, el 9.34% lo arrojan en algún terreno baldío o en los esteros, el 56.50% queman la basura y las otras formas de eliminación son de índices menores.

Energía Eléctrica

En el cantón existe un 89.23% de acceso a la luz eléctrica del servicio público, el 8.40% no tienen este servicio y porcentaje se abastece de otra forma de energía eléctrica.

Educación

Para esta información se considera la población mayor a los 5 años, los resultados nos muestran que el 9.22% no tienen ningún nivel de instrucción, el 44.87% tienen instrucción primaria, el 19.59% indican que tienen instrucción secundaria, solamente el 3.21% poseen instrucción superior.

Equipamiento Educativo

En el cantón Mocache existen 104 centros educativos, de los cuales 97 se encuentran localizados en el área rural y 17 en el área urbana. Así mismo 90 Centros son de educación básica es decir son las conocidas escuelas tradicionales, 9 centros educativos tienen educación inicial o también conocidos como jardín de infantes y escuela y 5 tienen educación básica y bachillerato, es decir colegios.

Acceso a la Salud Pública

La cobertura de servicios de salud en el cantón es la siguiente: dos Sub Centros de Salud de Mocache y un subcentro de salud en Bella Aurora, y una clínica privada con atención básica y especializada, ambulatoria.

Vías o caminos

En Mocache hay varios tipos de vías, estas son: Vías de primer orden, de segundo y de tercer orden, además de vías de verano y senderos.

PEA del cantón

En los niveles de ocupación vemos que se ratifica que el cantón tiene como ocupación principal la agricultura con un porcentaje del 66.31%, el siguiente en importancia es el comercio al por mayor y menor con un 6.63%, los demás son índices menores, existe un 9.82% que no declara su ocupación.

5. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, no cuenta con una metodología establecida para la evaluación de impactos ambientales, la metodología utilizada para la identificación de los principales impactos ambientales en el presente documento, es la matriz causa – efecto de Leopold. Una metodología cualitativa, preliminar y apropiada para valorar las diversas alternativas de un mismo proyecto. La base sistemática de la matriz, es una columna de “entradas”, en donde se detalla las acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente, y en sus filas, las características del medio ambiente (factores ambientales) que pueden ser alterados. De esta manera se puede definir las interacciones existentes.

Los factores ambientales definidos para la evaluación de impactos, han sido seleccionados en base a la caracterización y condiciones del área del proyecto. Cabe resaltar que en estos factores son donde las actividades desarrolladas tienen un impacto positivo o negativo. La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+) o negativa (-), dependiendo si el impacto es adverso o benéfico para el entorno. Posteriormente, de acuerdo a la importancia y magnitud de cada impacto se asigna un valor a cada uno de ellos con el fin de determinar si el impacto es significativo o no significativo.

Impactos Negativos

Significativo.- Impacto que genera alteraciones negativas hacia el medio ambiente y puede ser remediado a mediano y largo plazo utilizando medidas de mayor complejidad para mitigar, controlar o remediar los impactos generados en el proyecto.

No Significativo.- Impacto que genera alteraciones poco representativas hacia el medio ambiente y puede ser remediado a corto plazo utilizando medidas sencillas y prácticas para evitar, controlar o mitigar los impactos generados en el proyecto.

Impactos Positivos

Significativo.- Impacto que genera consecuencias favorables al ambiente o humano.

En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la matriz y el resumen de la evaluación de impactos ambientales correspondientes al presente estudio. Los principales impactos ambientales evaluados en la ejecución de la estrategia de mejoras integrales y reaperturas de las unidades educativas son los que se presenta en la tabla a continuación:

Tabla 4 Impactos ambientales

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES				
FASE DERROCAMIENTO / PICADO				
ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	SIGNIFICATIVO/ NO SIGNIFICATIVO	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
Demolición total o parcial de infraestructura	Generación de material particulado	Contaminación del aire	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada Herramienta menor
Demolición total o parcial de mampostería	Generación de escombros	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Herramienta menor
Picado y resanado de mampostería				
FASE MEJORAS				

ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	SIGNIFICATIVO/ NO SIGNIFICATIVO	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
Adecuación del terreno Nivelación	Movilización de maquinaria y transporte de materiales	Alteración del suelo por movimiento de tierras	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada
Adecuación del área de construcción del proyecto	Cambio del entorno paisajístico	Alteración de las especies arbóreas	Negativo No Significativo	Motosierra, hacha
Construcción de cimentaciones y/o estructuras	Generación de ruido	Contaminación de aire por ruido	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada Concreteira
	Generación de desechos	Contaminación de suelo	Negativo No Significativo	Material Pétreo Acero Hormigón
	Riesgo de derrame de cemento y mezclas de hormigón	Contaminación de agua	Negativo No Significativo	Material Pétreo Hormigón
Levantamiento de infraestructura	Generación de desechos	Contaminación de suelo y agua	Negativo No Significativo	Acero de refuerzo
Utilización de maquinaria pesada empleada en la ejecución del proyecto	Generación de residuos sólidos contaminados con hidrocarburos	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Hidrocarburos
Construcción de pisos y losas	Generación de material particulado	Contaminación de aire y agua	Negativo No Significativo	Maquinaria pesada Concreteira Material Pétreo Acero Hormigón
	Generación de residuos	Contaminación de agua	Negativo No Significativo	
	Posiciones forzadas y repetitivas	Enfermedades ocupacionales	Negativo No Significativo	
Construcción de áreas internas y espacios exteriores	Generación de desechos	Alteración del paisaje	Negativo No Significativo	Hormigón bloques, ladrillos
	Movilización de maquinaria y transporte de materiales	Alteración del suelo por el proceso de construcción	Negativo No Significativo	Hormigón bloques, ladrillos
Utilización como aditivos para maquinaria de construcción	Generación de residuos sólidos y líquidos peligrosos	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Productos Químicos
	Generación de residuos sólidos y líquidos peligrosos	Contaminación del agua	Negativo No Significativo	
Construcción de acabados	Generación de material particulado	Contaminación del aire	Negativo No significativo	Mampostería, pinturas, esmaltes. Amoladoras, taladros, cortadoras de cerámica
	Posiciones forzadas y repetitivas	Enfermedades ocupacionales.	Negativo No Significativo	
Instalación y equipamiento eléctrico y electrónico	Generación de desechos	Afectación a la salud Contaminación del aire	Negativo No Significativo	Amoladoras, taladros, equipo eléctrico
	Accidentes laborales por uso inadecuado de maquinaria	Enfermedades ocupacionales.	Negativo No Significativo	

Construcción	Generación de empleo	Estilos de vida Contratación de mano de obra temporal y permanente	Positivo Significativo	-
FASE DE OPERACIÓN				
ACTIVIDAD	ASPECTO	IMPACTOS POTENCIALES	SIGNIFICATIVO/ NO SIGNIFICATIVO	MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS
Manejo de residuos sólidos	Generación de malos olores, emisión de partículas	Contaminación del aire	Negativo No Significativo	Residuos sólidos
Manejo de residuos sólidos	Mal manejo de desechos sólidos	Contaminación del suelo	Negativo No Significativo	Residuos sólidos
Manejo de residuos sólidos	Generación de vectores	Molestias en la población aledaña	Negativo No Significativo	Residuos sólidos
Seguridad y accesos no autorizados	Administración inadecuada de ingreso de personas a las instalaciones	Venta, consumo de alcohol y drogas. Robos a las instalaciones del predio	Negativo No Significativo	-

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Registro Oficial No. 316 del 04 de mayo de 2015, se puede definir al Plan de Manejo Ambiental (PMA) como: *“Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste en varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto.”*

El presente PMAS, contempla las acciones de prevención, mitigación, control y compensación de los impactos generados por las actividades de construcción y operación de la Escuela de Educación Básica Napo Galeras y se compone de los siguientes subplanes:

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.
- Plan de Manejo de Desechos.
- Plan de Comunicación y Capacitación.
- Plan de Gestión Social.
- Plan de Contingencias y Emergencias.
- Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
- Plan de Monitoreo y Seguimiento.
- Plan de Cierre y Abandono.

Responsables

El Ministerio de Educación será responsable de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental y Social, a través del contratista durante la ejecución de las actividades de mejoras integrales. La supervisión de la aplicación de los rubros, cantidades y presupuestos de este plan estará a cargo de la Fiscalización de la obra.

6.1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos							
Objetivo	Evitar, reducir o prevenir oportunamente la ocurrencia de impactos ambientales negativos y que interfieran significativamente en el desarrollo de todas las actividades de mejoramiento integral de la Escuela de Educación Básica Napo Galeras						PMPM-01
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras						
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.					Plazo	
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización
Emisiones de material particulado	Contaminación del aire	De ser posible y cuando se requiera, realizar la cobertura del perímetro de la intervención mediante lonas.	No. de lonas instaladas / No. de lonas requeridas	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Emisiones de material particulado	Contaminación del aire	El transporte del material pétreo, áridos y/o escombros, se deberá realizar en volquetas que cuenten con lonas o cobertores, desde el sitio de carga hasta el de descarga.	No. volquetas cubiertas /No. volquetas para trasporte de material pétreo.	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Emisiones de material particulado	Contaminación del aire	Cuando existan movimientos de tierra y las condiciones climáticas lo ameriten, se deberá mantener húmeda la zona mediante la aspersión de agua.	Áreas regadas / Áreas que requieren ser regadas	Registro fotográfico Facturas de tanqueros	Desde la ejecución del proyecto	Cada vez que se lo requiera	Fin de la vida útil del proyecto
		Cuando existan acumulaciones de material árido para construcción o montículos de tierra producto de excavaciones, de acuerdo a las condiciones climáticas se deberán mantener humedecidas o cubiertas, para evitar la dispersión del material.	Área cubiertas o regadas / áreas que requieran ser regadas o cubiertas	Registro fotográfico Facturas de tanqueros	Desde la ejecución del proyecto	Cada vez que se lo requiera	Fin de la vida útil del proyecto
Emisiones gaseosas de fuentes móviles de combustión	Contaminación del aire	Mantener apagada la maquinaria y equipos que no se utilicen durante los trabajos.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro de horas de trabajo de los diferentes	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto

				equipos y maquinarias.			
Generación de efluentes	Contaminación del agua	En el caso que requiera, se instalará de forma temporal baterías sanitarias para el personal en obra. Estas podrán ser del tipo baño químico o sus desagües de aguas servidas se conectarán a la red pública.	No. De baterías instaladas / No. De baterías requeridas	Registro de instalación de las baterías Registro fotográfico fechado desde la cámara Facturas	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Hasta cuando se requiera
Generación de efluentes	Contaminación del agua	Utilizar recipientes plásticos o tanques para recoger los restos de agua resultante del lavado de las herramientas de trabajo que tienen contacto tanto con morteros como residuos de hormigón etc., la misma que será utilizada en el proceso de fraguado del hormigón	No. De recipientes utilizados / No. De recipientes requeridos	Registro de compra de los recipientes Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde la ejecución del proyecto	Cada vez que se lo requiera	Fin de la vida útil del proyecto
Derrames, infiltraciones, liqueos	Contaminación del suelo	Disponer de un espacio exclusivo en el cual se realizará la carga y descarga de escombros y provisión de materiales. Este lugar estará debidamente señalizado, delimitado y en lugar donde no pueda afectar a la comunidad educativa, el área de influencia o a los obreros.	Espacio implementado / Espacio requerido	Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Derrames, infiltraciones, liqueos	Contaminación del suelo	De requerirse el mantenimiento de equipos, maquinaria y/o vehículos utilizados en la obra, estos se deberán realizar en talleres técnicos especializados, fuera del área del proyecto	No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos programados	Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde la ejecución del proyecto	Cada vez que se lo requiera	Fin de la vida útil del proyecto
Derrames, infiltraciones, liqueos	Contaminación del suelo	De requerirse el almacenamiento de combustibles, este se realizará en sitio específico, que se encuentre alejado de la comunidad educativa, del área directa de trabajo y de fuentes de agua o alcantarillado,	Área implementados / Área requerida	Registro fotográfico fechado desde la cámara	Desde la ejecución del proyecto	Cada vez que se lo requiera	Fin de la vida útil del proyecto

		<p>Este sitio contará con las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sitio cubierto (bajo techo). -Adecuada ventilación -Piso impermeabilizado. -Acceso restringido. -Señalética de identificación, prohibición y prevención. -Cubeto del 110% del tanque mayor -Almacenamiento en recipientes adecuados para ese propósito. -Extintor contra incendios -Kit anti derrames 					
--	--	--	--	--	--	--	--

6.2. Plan de Manejo de Desechos

Plan de Manejo de Desechos							
Objetivo	Implementar un programa integral para el manejo de los desechos sólidos no domésticos con el fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos adversos que pudieran presentarse en el ambiente durante las actividades de mejoras integrales de la Escuela de Educación Básica Napo Galeras						PMD-02
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras						
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.				Plazo		
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del Suelo Contaminación del aire	Se prohíbe la quema de vegetación o de desechos al interior del proyecto	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del Suelo	Separación de residuos en la fuente y almacenamiento secundario en recipientes ubicados en cada área de trabajo, de acuerdo al sistema de colores establecidos en la NTE INEN 2841	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto

Generación de desechos sólidos peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	Identificar y clasificar los desechos peligrosos y especiales de acuerdo a lo establecidos en el Anexo B y Anexo C, del acuerdo ministerial No. 142	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Generación de desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	Llevar una bitácora de la generación de desechos sólidos no peligrosos, que debe incluir: -Fecha de entradas y salidas del desecho -Nombre del desecho -Origen del desecho -Cantidad (peso del desecho) -Destino del desecho (Gestor) -Responsables y firmas de responsabilidad	Cumple= 1 No Cumple= 0	Bitácora mensual de generación de desechos Reciclables Bitácora mensual de generación de desechos peligrosos	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Generación de desechos sólidos no peligrosos	Contaminación del Suelo	Contar con una zona de almacenamiento primario de desechos reciclables que cuente con las siguientes condiciones técnicas: -Sitio cubierto (bajo techo). -Piso impermeabilizado. -Acceso restringido. -Señalética de identificación, prohibición y prevención.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Generación de desechos sólidos peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	En el caso que se requiera contar con una zona de almacenamiento primario de desechos peligrosos y especiales que cuente con las siguientes condiciones técnicas: -Sitio cubierto (bajo techo). -Piso impermeabilizado. -Acceso restringido. -Señalética de identificación, prohibición y prevención.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto

		<ul style="list-style-type: none"> -Contenedores de almacenamiento con las etiquetas de acuerdo a la norma técnica -Mantener las hojas de seguridad en el sitio -Extintor contra incendios -Kit anti derrames -Mantener el orden y limpieza en dicha zona 					
<p>Generación de escombros, desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales</p>	<p>Contaminación del Suelo</p>	<p>Entregar los escombros a escombreras autorizadas, los desechos sólidos reciclables y los desechos peligrosos a gestores calificados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.</p>	<p>Cantidad de desechos entregados/ Cantidad de desechos generados</p>	<p>Peligrosos y especiales: Autorización Ambiental del gestor, Manifiesto Único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos. Sólidos no peligrosos: Autorización Ambiental del gestor, Recepción de entrega y recepción. Autorización de descarga en escombrera</p>	<p>Desde la ejecución del proyecto</p>	<p>Permanente</p>	<p>Fin de la vida útil del proyecto</p>

6.3. Plan de Comunicación y Capacitación

Plan de Comunicación y Capacitación							
Objetivo	Establecer medidas para instruir y concientizar al personal en todo el contexto de lo que se entiende por Gestión Ambiental, control y prevención de la Contaminación Ambiental, actores directos e indirectos que tengan relación o puedan tener relación con aspectos ambientales significativos						PMCC-03
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras						
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.				Plazos		
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización
Prevención de la contaminación ambiental	Contaminación de los recursos naturales	Difundir el Plan de Manejo Ambiental al personal de la obra, mediante reuniones programadas	# de reuniones realizadas / # de reuniones planificadas	Cronograma de reuniones y registro de las mismas	Desde la ejecución del proyecto	Trimestral	Finalización de la vida útil del proyecto
Generación de escombros, desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y especiales	Contaminación del Suelo	Capacitación al personal de obra para la correcta separación y almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, peligrosos y escombros.	# capacitaciones realizadas / #capacitaciones planificadas	Cronograma de capacitaciones Lista de asistencia a la capacitación Registro Fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Seguridad Ocupacional	Riesgos en la salud	Difundir al personal de la obra y ala comunidad educativa, sobre el Buzón del Mecanismo para Quejas y Reclamos que se encontrará en el sitio donde se ejecute la obra.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones planificadas	Registros de capacitaciones firmados	Desde la ejecución del proyecto	Desde el inicio del proyecto y cada vez que ingrese personal nuevo	Finalización de la vida útil del proyecto
Seguridad Ocupacional	Riesgos en la salud	Desarrollar y ejecutar capacitaciones periódicas al personal de la obra, para el correcto uso de Equipos de Protección Personal de acuerdo a las actividades que se vayan a realizar.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones planificadas	Registros de capacitaciones firmados	Desde la ejecución del proyecto	Mensual	Finalización de la vida útil del proyecto

6.4. Plan de Gestión Social

Plan de Gestión Social							
Objetivo	Establecer buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto						PMRC-04
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras						
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.				Plazos		
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización
Sociedad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Realizar un taller de socialización a los trabajadores, comunidad educativa y principales actores, con el fin de dar a conocer los contratistas, el proyecto y la Ficha de Gestión Ambiental y Social.	# reuniones ejecutadas / # de reuniones requeridas	Informe de reunión	Antes del inicio de la obra	Cuando se lo requiera	Finalización de la vida útil del proyecto
		Difundir con todo el personal de la obra y verificar el estricto cumplimiento del Código de conducta que se estableció para la ejecución de la obra.	# de personal de obra que recibió el código de conducta / # de personal de obra	Registro de difusión Informe	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
		Implementar un buzón en obra para receptor las Quejas y Reclamos durante la ejecución de la obra.	#de quejas o sugerencias resueltas / # de quejas o sugerencias receptadas	Registro de las quejas o sugerencias receptadas	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
		Dar seguimiento a las denuncias o comunicados receptados por el buzón del Mecanismo para Quejas y Reclamos hasta que sean solucionadas	# denuncias recibidas/ # denuncias atendidas	Acta de compromisos	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
Sociedad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	En el caso de que se requiera cerrar vías o afectar a la comunidad cercana a la institución educativa por movimiento materiales, maquinaria o equipos, se deberá coordinar con la Autoridades	# eventos coordinados / # eventos requeridos	Acta de compromisos	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto

		Locales, Comunidad Educativa y Constructora, para establecer el mecanismo, vías, horarios y/o lugares para que no se afecte.					
Sociedad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	En caso de denuncias graves por la comunidad, se acordará realizar una reunión con los denunciantes para tratar el motivo de la misma, la cual deberá ser comprobada para poder establecer las medidas concretas a través de un acta de compromisos. Se deberá entregar una copia a los denunciantes.	# denuncias recibidas/ # denuncias atendidas	Acta de compromisos	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
Sociedad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Realizar el seguimiento a la ejecución de los compromisos acordados con la comunidad.	# compromisos ejecutados / # compromisos acordados	Informe de cumplimiento de actividades acordadas	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
Sociedad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Gestionar de manera adecuada el pago de obreros pertenecientes de la comunidad que fueron contratados y mantenerlos afiliados	# actas de entrega de pago firmadas entregadas / # actas de entrega de pago no entregadas	Actas de entrega de pagos con firmas de responsabilidad	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
Sociedad	Generación de empleo. Mejora de la calidad de vida	Se deberá realizar la contratación de mano de obra local de al menos un 25% de su planilla	% de mano de obra local contratada / % de mano de obra local requerida	Planilla de trabajadores Reporte Encuentra empleo Informe	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Fin de la vida útil del proyecto
Sociedad	Generación de molestias en la vida diaria de comunidades cercanas al proyecto	Gestionar de manera adecuada la entrega de EPP a obreros pertenecientes de la comunidad que fueron contratados	# de obreros con EPP / # total de obreros	Registro de entrega de EPP Registro fotográfico	A partir de la aprobación del Plan de Manejo Ambiental	Cuando aplique	Finalización de la vida útil del proyecto

6.5. Plan de Contingencias

Plan de Contingencias y Emergencias							
Objetivo	Determinar las instrucciones para cada caso de contingencia o emergencia, para controlar, mitigar el impacto y prevenir futuros incidentes. Contempla las siguientes situaciones: Explosiones e incendios, Intoxicaciones, Emisiones accidentales a la atmósfera, Efectos nocivos al ecosistema, fauna, flora y seres humanos						PMCE-05
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras						
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.				Plazos		
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización
Incendios o explosiones	Riesgos endógenos	De producirse una contingencia dentro de las instalaciones donde se desarrolla la obra, se analizará la causa raíz y se establecerán acciones correctivas a ser implementadas	# de contingencias que se implementaron acciones correctivas / # de contingencias que requieren acciones correctivas	Reportes de contingencias presentadas y acciones tomadas	Desde la ejecución del proyecto	Cuando se produzca una contingencia	Hasta que termine la contingencia
Salud y seguridad ocupacional	Riesgos endógenos	Ubicar estratégicamente carteles provisionales en material resistente a la intemperie, los números telefónicos de emergencia actualizados (ECU 911, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional)	# de carteles colocados /# de carteles requeridos	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
Probabilidad de presentarse situaciones de emergencia- riesgos ambientales (derrames, mal manejo de sustancias químicas)	Afectación a la salud y seguridad del personal y pobladores del sector	Implementar y mantener un registro de los centros de salud más cercanos al sitio donde se ejecuta la construcción y difundirlo con el personal de la obra.	Cumple= 1 No Cumple= 0	Registro de los centros de salud más cercanos y registro de la difusión al personal de la obra.	Desde la ejecución del proyecto	Cada vez que se requiera.	Finalización de la vida útil del proyecto
	Contaminación de suelo y aire	Implementar y mantener de acuerdo a las necesidades uno o varios botiquines de primeros auxilios con los	# de botiquines adquiridos/ # de botiquines requeridos	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto

peligrosas y/o hidrocarburos)	implementos necesarios para solventar cualquier emergencia.					
	Implementar y mantener de acuerdo a las características del sitio de obra uno o varios extintores, estos se encontrarán debidamente señalizados y de fácil acceso.	# de extintores implementados / # de extintores requeridos	Registro fotográfico	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto

6.6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial							
Objetivo	Establecer medidas para garantizar que los trabajadores desarrollen sus actividades bajo un ambiente de trabajo seguro sin comprometer su seguridad, salud e integridad física, además identificar los potenciales riesgos que tiene la empresa en cada una de sus actividades y procesos productivos a fin de minimizarlos.						PMSSO - 06
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras						
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.				Plazos		
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización
Generación de riesgos al personal (accidente laboral, enfermedad ocupacional por lesiones, cortaduras, atrapamientos, aplastamientos. Levantamiento de carga, exposición a	Afectación a la salud y seguridad del personal	Realizar capacitaciones sobre los posibles riesgos a los que estarán expuestos los trabajadores.	# de capacitaciones realizadas /# de capacitaciones programadas	Registro de Capacitaciones	Desde la ejecución del proyecto	Semanal	Finalización de la vida útil del proyecto
		Dotar a los trabajadores de los EPP's necesario, de acuerdo a las actividades para reducir el riesgo de accidentes o enfermedades ocupacionales.	# trabajadores con EPP's / # trabajadores totales	Actas de entrega	Desde la ejecución del proyecto	Cuando sea necesario	Finalización de la vida útil del proyecto
		Implementar señalética informativa, restrictiva y obligatoria en el área donde se desarrollan los trabajos.	# de áreas señalizadas / # áreas totales	Fotográfico/ Facturas	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto

productos químicos, manipulación de maquinaria y herramientas)	Notificar al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) en caso de accidente laboral y enfermedad ocupacional	# de notificaciones realizadas / # de accidentes ocurridos	Informe de Notificación al IESS	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
	Prohibir el ingreso del personal que se encuentre bajo efectos del alcohol y/o sustancias estupefacientes.	# de trabajadores prohibidos el ingreso / # De trabajadores identificados bajo los efectos de alcohol y/o sustancias estupefacientes.	Registro de trabajadores prohibidos de ingreso.	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto

6.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Plan de Monitoreo y Seguimiento							
Objetivo	Mantener el Monitoreo de las fuentes que posiblemente pueden afectar a la calidad ambiental del área de influencia de la Escuela de Educación Básica Napo Galeras					PMMS-07	
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras						
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.			Plazos			
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	Periodicidad	Finalización
Generación de residuos sólidos Generación de ruido Generación de polvo Riegos laborales	Afectación a las personas Contaminación de suelo, agua. Enfermedades laborales. Conflictos socio ambientales.	Se deberá verificar que se dé estricto cumplimiento de todas las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y Social, durante las actividades de construcción	# de medidas cumplidas/ # de medidas planteadas	Fotografías Facturas Registros Actas Oficios	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto
Riesgos laborales	Afectación a la salud de los trabajadores	Realizar inspecciones diarias a fin de dar cumplimiento y seguimiento de las medidas expuestas en el plan de	Check list generados bimestralmente /	Hojas de registro y control Check list	Desde la ejecución del proyecto	Permanente	Finalización de la vida útil del proyecto

		seguridad y salud ocupacional, mediante hojas de check list.	Check list planificados	Registro fotográfico			
--	--	--	-------------------------	----------------------	--	--	--

6.8. Plan de Cierre, Abandono y Entrega

Plan de Cierre y Abandono						
Objetivo	Devolver el terreno en sus condiciones originales antes del inicio de las operaciones de la Escuela de Educación Básica Napo Galeras					PMCA-08
Lugar de aplicación	Escuela de Educación Básica Napo Galeras					
Responsable	El Ministerio de Educación, será responsable de la ejecución del PMAS a través del contratista durante la fase de construcción y directamente en la operación del proyecto.					Plazos
Aspecto Ambiental	Impacto Identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medios de verificación	Inicio	
Generación de escombros	Contaminación del suelo	En el caso de existir áreas contaminadas por la gestión de desechos peligrosos, se deberá realizar la remediación conforme los daños	m2 de áreas remediadas / m2 de áreas contaminadas	Respaldo fotográfico Firma de Acta entrega	Finalización de la vida útil del proyecto	
		Realizar el desmontaje y retiro de equipos y maquinaria que se utilizó en la construcción del proyecto	Área libre de equipos y maquinarias 100%		Finalización de la vida útil del proyecto	
	Afectación al paisaje y entorno	Dejar el área totalmente limpia, libre de escombros y materiales excedentes, incluyendo desmontajes de bodegas y casetas. Se tomará en consideración esta acción al momento de firmar el acta de entrega definitiva por parte del contratista.	Área libre de escombros 100%		Finalización de la vida útil del proyecto	

6.9. CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla 5 Cronograma del Plan de Manejo Ambiental y Social


CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)										
Actividades	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Plan de Mitigación y Prevención										
Cobertura del perímetro con lonas										
Cubierta de lonas para las volquetas										
Humedecer la zona de construcción										
Implementar área de almacenamiento de combustibles										
Instalación de baterías sanitarias temporales										
2. Plan de Manejo de Desechos										
Uso de recipientes adecuados para desechos										
Implementación de un área de almacenamiento de desechos										
Capacitación a los trabajadores para la separación adecuada de desechos										
Bitácora de desechos no peligrosos producidos										
Entrega de residuos reciclables a gestores calificados, desalojo de escombros en escombreras autorizadas y desechos peligrosos a gestores calificados en el MAATE										
3. Plan de Comunicación										
Difusión del Plan de Manejo Ambiental y Social										
Capacitación del uso de EPP										
Difusión del Mecanismo para quejas y reclamos										
4. Plan de Gestión Social										
Taller socialización del PMAS con los trabajadores, comunidad educativa y principales actores sociales										
Difusión del Código de Conducta con los trabajadores										
Implementar el Buzón en obra para la recepción y solución de quejas y reclamos										
Reuniones en caso de denuncias graves por parte de la comunidad										
Gestión del pago adecuado a obreros de la comunidad										
Gestión de la entrega adecuada de EPP a obreros de la comunidad										
Gestionar la contratación de mano de obra loca, al menos el 25% de su planilla										
5. Plan de Contingencias										

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)										
Actividades	MESES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Análisis de las contingencias producidas										
Implementación de señalética										
Elaboración e implementación del Plan de emergencia										
Contar con un registro de los centros de salud más cercanos										
Dotación de botiquines										
6. Plan de Seguridad y Salud										
Capacitaciones para los trabajadores										
Dotación de EPP										
Implementar señalética informativa, restrictiva y obligatoria en el área donde se desarrollan los trabajos.										
Notificaciones al IESS en caso de accidente laboral y enfermedad ocupacional										
7. Plan de Monitoreo y Seguimiento										
Bitácora donde se registre el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental y Social.										
8. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área										
Desmontaje y retiro de equipos y maquinarias utilizadas en la obra										
Limpieza del área donde se realizó los trabajos										

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gobierno Autónomo Descentralizado del Canto Mocache. (2020). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Mocache.

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboración del Documento		
Luis Miguel Abarca	Especialista de Gestión Ambiental Proyecto PARECF 2022	 <p>Firmado electrónicamente por: LUIS MIGUEL ABARCA MENDOZA</p>

9. ANEXOS DE LA FICHA AMBIENTAL

Anexo Nro. 1: Salvaguardas Banco Mundial

Anexo Nro. 2: Autorización Ambiental

Anexo Nro. 3: Rubros y Especificaciones Técnicas
