

MINEDUC - Ministerio de Educación
Coordinación General de Gestión Estratégica
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

PROYECTO: K006 MINEDU-SITEC- Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad SITEC

Líder del Proyecto:	Quintanilla González, Edison Omar (edison.quintanilla@educacion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cano Rojas, Ana Paulina	Programas Relacionados:	Programa Nacional de Gobierno Electrónico, Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGIAS PARA LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD
Titular:	Varela Bolaños, Carmita Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	10,140,789,782.00
CUP:	91400000.378.4136	TIR:	21.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	496,784,102.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	22,358,643.84
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/03/2010 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	05/08/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Quintanilla Gonzalez, Edison Omar	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2015

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción
<p>DESCRIPCIÓN GENERAL: El proyecto SITEC para el período 2015 - 2017 se ejecutará a través de la Dirección Nacional de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional, que está bajo de la Coordinación General de Gestión Estratégica. Esta unidad, según lo establece el nuevo estatuto orgánico del Ministerio de Educación, tiene como misión "Visualizar, administrar, Implementar y supervisar las mejores prácticas de procesos de transformación transversales dentro y fuera de la institución, a través de la gestión institucional y empoderamiento a los servidores públicos, orientando a un desarrollo continuo de la cultura organizacional y/o madurez institucional". El Ministerio de Educación a través del Proyecto "Sistema Integral de Tecnología para la Escuela y Comunidad", requiere dotar a los docentes de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal de medios informáticos para el acceso a una plataforma tecnológica de gestión de control escolar y de entorno virtual de aprendizaje conocida como Comunidad Educativa en Línea para impulsar la innovación en el proceso de enseñanza -aprendizaje y vincular a los miembros de la comunidad educativa.</p> <p>OBJETIVOS:OBJETIVO GENERAL:</p>

DATOS GENERALES

Descripción

Facilitar la gestión educativa mediante el acceso y uso de servicios otorgados por medios electrónicos a los miembros de la comunidad educativa nacional contribuyendo al mejoramiento continuo de la calidad de la educación mediante la generación de registros académicos, el incremento de las competencias profesionales en los docentes y fomentando el aprendizaje potenciado por la tecnología. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a. Implementar un modelo de gestión de servicios de TI en las IE's públicas.
- b. Usar TI en el aula y fuera de ella en los miembros de la Comunidad Educativa.
- c. Implementar un modelo de gestión escolar.

Beneficios Cualitativos

El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad -SITEC- se crea para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa con la implementación de políticas y estándares para la aplicación de las Tecnologías de información y comunicación (TIC) en las aulas, fomentando la ciudadanía digital a través de la dotación de equipo informático y el uso de tecnologías e Internet en todos los establecimientos educativos fiscales de educación regular en todo el país. Para que en el lapso de cinco años se haya construido e implementado un sistema integral de tecnologías para la escuela y la comunidad en todo el sistema educativo fiscal del país que apoye la calidad de la educación nacional en los siguientes temas: Implementación de infraestructura tecnológica a todos los establecimientos educativos del país bajo los estándares del SITEC. Implementación de software educativo virtual para cada nivel de educación: inicial, básica, bachillerato, en español, inglés, Kichwa y Shuar. Capacitación y formación a todos los actores del quehacer educativo en el uso de tecnologías aplicadas a la educación. Creación de sistemas de seguimiento, evaluación y sostenibilidad del proyecto. Creación del programa Comunidad Educativa en Línea.

Tipo de Beneficiario

Instituciones Educativas ecuatorianas, directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa.

Restricciones

Las principales restricciones que generan amenazas para alcanzar los objetivos son:

TIEMPO: El plazo previsto para la ejecución del presente proyecto es de ocho años, desde 2010 hasta 2017.

COSTO: El costo total del proyecto es de \$ 250.883.824,91.


RECURSOS: Recursos financieros asignados para contratación de personal, gastos administrativos y gastos operativos..

ALCANCE: La cobertura del Proyecto es a nivel Nacional, en los sectores rurales y urbanos del país. Comprende las 24 provincias, de las 9 zonas administrativas del país, distribuidas de la siguiente manera: Zona Provincia 1 Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbios 2 Pichincha, Napo y Orellana 3 Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 4 Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas 5 Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos 6 Azuay, Cañar, y Morona Santiago 7 El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 8 Guayaquil, Samborondón, Durán 9 Distrito Metropolitano de Quito

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 69.25 %

Fecha de Inicio: 05/03/2010

Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

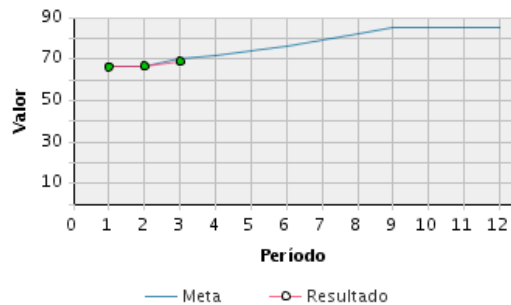

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	66 %	67 %	70 %	72 %	74 %	76 %	79 %	82 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Avance real acumulado											
	66 %	67 %	69 %									
Estado												
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2105:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se han desarrollado módulos de mejoras de funcionalidad en el portal Educar Ecuador, en relación al registro de asistencia. 2.- Se han implementado los módulos para el registro de la planificación educativa institucional por parte de las IE. 3.- Se han realizado capacitaciones a 144 dinamizadores CEL y 6500 docentes pertenecientes a Instituciones Educativas del régimen Costa 2015-2106, en relación al manejo de los nuevos módulos implementados en el portal Educar Ecuador. 4.- Se han registrado hasta el 30 de julio un total de 1798284 estudiantes, 8809 rectores, 116203 docentes, en 15081 instituciones educativas de los escenarios A, B y C a nivel nacional. 5.- Se ha registrado en un 60% de las notas obtenidas en las diferentes asignaturas de los estudiantes de instituciones educativas de régimen costa periodo 2015-2016 del escenario A y B, correspondiente al primer periodo del primer quimestre. 	<p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p>	<p>05/08/2015 - 03:53 PM</p>
<p>JUNIO 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Capacitación a los dinamizadores CEL en relación a conocimientos de procesos y procedimientos de componente Comunidad Educativa en Línea, en las diferentes coordinaciones zonales 2.Se realizó la capacitación a docentes, rectores y dinamizadores CEL en las diferentes zonales acerca del registro de asistencias de estudiantes por parte de los docentes en las Instituciones Educativas del ciclo costa periodo 2015-2106. 3.Capacitación en relación a los procesos y actividades que se desarrollan en la ejecución del componente Comunidad Educativa en Línea a los responsables de atención ciudadana a nivel distrital. 4.Se han registrado hasta el 31 de Junio un total de 1'759.160 estudiantes, 2488 rectores, 101.745 docentes, pertenecientes a las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional. 5.Se han realizado en las IE de régimen costa perteneciente a las diferentes Coordinaciones Zonales la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e inicio de ingreso de notas en las instituciones educativas en relación a primer parcial del primer Quimestre de las zonas antes mencionadas. 6.No se han realizado transferencias en este mes. 	<p>Quintanilla Gonzalez, Edison Omar</p>	<p>06/07/2015 - 12:04 PM</p>
<p>MAYO 2015.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Se han realizado en las IE de régimen costa pertenecientes a las Coordinaciones Zonales 4, 5, 6, 7, 8 apoyo en la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e ingreso de notas en las instituciones educativas de las zonas antes mencionadas. 2. Se han registrado hasta el 31 de Mayo un total de 400.115 estudiantes, 2488 rectores, 101.745 docentes, pertenecientes a las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional. 3. Se solito a CNT EP que genere un respaldo de la informacion del contenido de la base de datos del portal EducaEcuador con la finalidad de poder generar el registro de notas para el nuevo periodo del régimen costa. 4. No se han realizado transferencias en este mes. 	<p>Tello Santillan, Christian Javier</p>	<p>10/06/2015 - 09:13 AM</p>
<p>ABRIL 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han realizado visitas in situ a las IE de régimen costa de diferentes coordinaciones zonales, con la finalidad de apoyar en la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e ingreso de notas en las instituciones educativas de las zonas antes mencionadas. 2. Se han registrado hasta el 30 de Abril un total de 1549141 estudiantes, 1557 rectores, 99289 docentes, en las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional. 3. Se ha registrado en un 40% de las notas obtenidas en las diferentes asignaturas de los estudiantes de instituciones educativas de régimen costa del escenario A. <p>No se realizaron transferencias.</p>	<p>Tello Santillan, Christian Javier</p>	<p>11/05/2015 - 03:32 PM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se han realizado visitas in situ a las IE de régimen costa de diferentes coordinaciones zonales, con la finalidad de apoyar en la verificación y validación de registro de docentes, generación de distributivos e ingreso de notas en las instituciones educativas de las zonas antes mencionadas. 2. Se han registrado hasta el 31 de marzo un total de 1549141 estudiantes, 1557 rectores, 6603 docentes, en las instituciones educativas de los escenarios A y B a nivel nacional. 3. Se ha registrado en un 40% de las notas obtenidas en las diferentes asignaturas de los estudiantes de instituciones educativas de régimen costa del escenario A. 	<p>Tello Santillan, Christian Javier</p>	<p>09/04/2015 - 03:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ENERO - FEBRERO 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la Reformulación del Proyecto "Sistema Integral de Tecnología para la Escuela y Comunidad - SITEC", por el período 2010 - 2017 a la Dirección Nacional de Planificación Técnica con el fin de que se envíe el documento al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano para las respectivas observaciones del mismo. (Asociado al Hito 160) 2. Presupuesto aprobado inicial para el proyecto SITEC 2015 y elaboración de la Programación del PAI 2015 - SITEC. (Asociado al Hito 162 y 163). 3. Se realizó el análisis y la distribución de técnicos SITEC distritales para cada una de las Coordinaciones Zonales (Asociado al Hito 161). 4. Transferencia de recursos para la contratación de 9 líderes zonales SITEC y 97 técnicos distritales SITEC (Asociado al Hito 164). 5. El equipo de seguimiento del proyecto realizó la verificación registro y alta de usuarios de rectores, docentes, registro y generación de distributivos, ingreso de notas de 133 instituciones educativas de sostenimiento fiscal a nivel nacional. 6. Migración de datos de docentes de los sistemas informáticos especializados del MinEduc hacia la Plataforma CEL. 7. Capacitación e inducción del manejo de la Plataforma CEL a los dinamizadores de las Coordinaciones Zonales 2 y 4. 8. Capacitación mediante conferencias virtuales a las Coordinaciones Zonales 1,5,7 y 8 	<p>Tello Santillan, Christian Javier</p>	<p>05/03/2015 - 05:45 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- El proyecto SITEC fue aprobado por un costo total de \$ 250.883.824,91, a la fecha al proyecto se le han asignado un total de \$ 31.597.946,15 por esta razón tiene un total del 7,75% de ejecución. Actualmente el proyecto se encuentra reformulándose hasta el 2017 para cumplir los objetivos y metas planteadas. 2.- No se han realizado transferencias en DICIEMBRE. 3.- Inducción de 3032 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de diciembre finalizado. (ASOCIACIÓN HITO 156). 4.- Análisis de 88 recursos para EGB de Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Educación Inicial. elaborado. (ASOCIACIÓN HITO 157). 5.- Documento de Reformulación del Proyecto SITEC hasta 2017 para transferencia de Proyecto a CNGE. (ASOCIACION HITO 158). 6.- Dictamen SENPLADES para ampliación del Proyecto, gestionado. (ASOCIACION HITO 159). 	<p>Cadena Baquero, Maritsa Liliana</p>	<p>05/01/2015 - 11:19 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- El proyecto SITEC fue aprobado por un costo total de \$ 250.883.824,91, a la fecha al proyecto se le han asignado un total de \$ 31.596.049,72 por esta razón tiene un total del 7,71% de ejecución. Actualmente el proyecto se encuentra reformulándose hasta el 2017 para cumplir los objetivos y metas planteadas. 2.- No se han realizado transferencias en NOVIEMBRE. 3.- Documento de reformulación del proyecto hasta el 2017 para la aprobación de las autoridades.(ASOCIACIÓN HITO 153). 4.- Inducción de 2322 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de Noviembre. (ASOCIACIÓN HITO 154). 5.- Análisis de recursos didácticos digitales para tabletas educativas para los estudiantes de segundo y quinto de básica. (ASOCIACIÓN HITO 155). 	<p>Andrade Palacios, Sara Imelda</p>	<p>05/12/2014 - 04:09 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- El proyecto SITEC fue aprobado por un costo total de \$ 250.883.824,91, a la fecha al proyecto se le han asignado un total de \$ 31.611.742,38 por esta razón tiene un total del 7,70% de ejecución. Actualmente el proyecto se encuentra reformulándose hasta el 2017 para cumplir los objetivos y metas planteadas. 2.- No se han realizado transferencias en OCTUBRE. 3.- Elaboración de Propuesta para el uso de tecnologías en el aula. (ASOCIACION AL HITO 149). 4.- Diseño de la estructura externa para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR (ASOCIACION AL HITO 150) 5.- Diseño de la estructura interna para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR (ASOCIACION AL HITO 151) 6.- Inducción de 2361 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de octubre. (ASOCIACION HITO 152) 	<p>Cadena Baquero, Maritsa Liliana</p>	<p>05/11/2014 - 05:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 11,31 % al mes de septiembre de 2014, según el reporte E-sigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$ 5,232,481.44 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 671.511,04 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias.</p> <p>2.- Taller de uso de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula dirigido a 40 docentes entre Técnicos Territoriales y personal de planta central, finalizado. (ASOCIACION HITO 146)</p> <p>3.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 6 y 7 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada. (ASOCIACION HITO 147)</p> <p>4.- Inducción de 1.193 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de septiembre finalizado. (ASOCIACION HITO 148)</p> <p>5.- No se han realizado transferencias en SEPTIEMBRE..</p>	<p>Andrade Palacios, Sara Imelda</p>	<p>04/10/2014 - 06:19 PM</p>
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 7,19 % al mes de agosto de 2014, según el reporte E-sigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$ 5.739.025,15 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 711.664,01 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias.</p> <p>2.- Análisis de recursos para 1 DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO elaborado. (hito asociado 143)</p> <p>3.- Socialización a docentes de 9 instituciones educativas referentes para la utilización de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula. iniciado. (hito asociado 144)</p> <p>4.- Inducción y capacitación de 3.704 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de agosto finalizado. (hito asociado 145)</p> <p>5.- No se han realizado transferencias.</p>	<p>Andrade Palacios, Sara Imelda</p>	<p>05/09/2014 - 05:45 PM</p>
<p>JULIO 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 6,18 % al mes de julio de 2014, según el reporte E-sigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$ 5.772.960,27 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 738.790,93 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 1 y 2 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada. (hito asociado 138)</p> <p>3.- Mapeo para 2 EGB para las tres áreas elaborado. (hito asociado 139)</p> <p>4.- Programa de capacitación, docentes preparados en el curso FORMADORES DE FORMADORES finalizado. (hito asociado 140)</p> <p>5.- Inducción y capacitación de 4.539 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de julio finalizado. (hito asociado 141)</p> <p>6.- Usuarios: 819 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector de la Etapa "SEMILLERO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA" finalizado. (hito asociado 142)</p>	<p>Cadena Baquero, Maritsa Liliana</p>	<p>05/08/2014 - 10:59 AM</p>
<p>Junio 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 4,28 % al mes de junio de 2014, según el reporte esigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$7.093.600,81 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 1.210.192,47 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- Mapeo para 4 EGB de las 3 áreas y Mapeo para 10 EGB para Lengua y Literatura elaborado. (hito asociado 133).</p> <p>3.- Continuación de la avanzada en capacitación Plan Lector iniciada. (hito asociado 134).</p> <p>4.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zona 9 e inicio de comunidades de aprendizaje en la Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo finalizada. (hito asociado 135).</p> <p>5.- Mapeo para 3 EGB para Entorno Natural y social elaborado. (hito asociado 136).</p> <p>6- 1851 personas alfabetizadas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de junio finalizado. (hito asociado 137).</p>	<p>Caiza Suquillo, José Huberto</p>	<p>02/07/2014 - 01:44 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 3,41% al mes de mayo de 2014, según el reporte esigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$7.093.600,81 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 1.210.192,47 se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- TDR e informe técnico para la elaboración de un recurso digital del idioma Shuar (relacionado hito 127).</p> <p>3.- 1738 personas alfabetizadas en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias.(relacionado hito 128).</p> <p>4.- 1854 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación regados. (relacionado hito 129).</p> <p>5.- Mapeo para 4 EGB de Ciencias Naturales y Mapeo de 10 EGB para Sociales elaborado. (relacionado hito 130).</p> <p>7.- Segunda etapa de la comunidad de aprendizaje iniciada. (relacionado hito 131).</p> <p>8.- Usuarios: 585 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector. (relacionado hito 132).</p>	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>04/06/2014 - 01:47 PM</p>
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1.- A la fecha el proyecto SITEC reporta una ejecución de 2.63% al mes de abril de 2014, según el reporte esigef. Esto se debe a que el techo presupuestario en el ministerio de Finanzas es de \$7.202.817,60 y el valor asignado y aprobado al proyecto es de \$ 1.319.409,26, se ha realizado las gestiones internas y externas para que el Ministerio de Finanzas realice las reformas necesarias. No se han realizado transferencias.</p> <p>2.- 1210 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 15 Instituciones Educativas de Enero a Marzo. (relacionado hito 120).</p> <p>3.- 6998 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación regados. (relacionado hito 121).</p> <p>4.- 1681 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 19 Instituciones Educativas. (relacionado hito 122).</p> <p>5.- Mapeo de RDD para 10 EGB en Ciencias Naturales y Matemática elaborado.(relacionado hito 123).</p> <p>6.- Creación de claves y contraseñas a 765 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector. (relacionado hito 124).</p> <p>7.- Estrategia de sostenibilidad del PCEL en la zona 3 e inicio de dos comunidades de aprendizaje en las UEM Penipe y Guano.(relacionado hito 125).</p> <p>8.- 1958 personas alfabetizadas en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias.(relacionado hito 126).</p>	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>05/05/2014 - 12:37 PM</p>
<p>Marzo 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Entrega de equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación. * Creación de claves y contraseñas a 3747 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector. * Clasificación de RDD por destrezas, aéreas y años de educación general básica y el levantamiento de la información a la plataforma EducarEcuador. * Elaboración del Manual y Guía para uso de las Aulas Tecnológicas Comunitarias. * 2736 docentes sensibilizados en el proyecto Comunidad Educativa en Línea en la Plataforma EducarEcuador a través de 41 Instituciones Educativas. * Sensibilización al equipo de las Coordinaciones zonales para la creación de comunidad de aprendizaje en cada institución educativa beneficiada con la sostenibilidad del programa "Comunidad Educativa en línea" con el apoyo de la Coordinación Educativa del MinEduc. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>04/04/2014 - 04:56 PM</p>
<p>Febrero 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inicio de la capacitación virtual con 3 sesiones presenciales, 1183 docentes de quince unidades educativas de la provincia de Pichincha, como una nueva metodología implementada en el Ministerio de Educación para la formación del docente ecuatorianos. * Capacitación de uso de equipo, Plan Lector y Plataforma Educativa en las provincias de: IMBABURA (2 INSTITUCIONES DEL MILENIO (JATUN KURAKA, SUMAK YACHANA): 84 docentes; CHIMBORAZO (2 INSTITUCIONES DEL MILENIO (GUANO, PENIPE): 66 docentes; PICHINCHA: 1 INSTITUCION (IDROBO): 152 DOCENTES; GUAYAS (1 INSTITUCIÓN (UEM ALFREDO VERA): 104 docentes. * Capacitación presencial en TIC 1: PICHINCHA en 2 INSTITUCIONES (FISCAL BICENTENARIO, UEM MUNICIPAL BICENTENARIO): 114 DOCENTES. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>05/03/2014 - 04:12 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Control-acompañamiento a la UEM Bicentenario, sesión vespertina y ajuste de la estrategia integral AD-TIC con la integración del Plan Lector en elaboración. * Creación de menús (11 de matemáticas, 11 de lengua, 6 de ciencias sociales, 6 de ciencias naturales.) para la plataforma EducaEcuador y programación en html de los Mapeos Curriculares de quinto año de educación general básica. * Creación de mapeos de Ciencias Sociales y Lengua para octavo año de educación general básica (9 RDD de ciencias sociales y 28 RDD de lengua) 		
<p>Enero 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Desarrollo del curso TIC I en las dos sesiones de la Bicentenario UEM y Unidad Educativa Fiscal, sur de Quito. . Desarrollo del Plan Lector en la Bicentenario UEM y Unidad Educativa Fiscal Municipal, sur de Quito. . Encuentro de inducción y asignación de responsabilidades para la implementación de la Plataforma EDUCARECUADOR, con los coordinadores zonales, los técnicos territoriales y los guarda almacén a nivel nacional. . Afinamiento de los servicios de la Plataforma de Gestión Educativa EDUCARECUADOR. . Lanzamiento del Proyecto Emblemático "Comunidad en Línea", en la UEM Aguirre Abad, de Guayaquil. . Construcción del modelo de control y seguimiento de los proyectos de la DNTE. . Afinamiento del Plan de Trabajo Anual por cada coordinación de la DNTE. . Desarrollo de la II etapa de la estrategia integral para facilitar con énfasis el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje: Modelo AD-TIC (Santo Domingo de los Tsáchilas, . Gestión y seguimiento del Proyecto Comunidad en Línea con CNTE - CONECTA (acuerdo interministerial) 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>06/02/2014 - 10:22 AM</p>
<p>DICIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de la Guía didáctica de contenidos para dictar cursos en las Aulas Tecnológicas Comunitarias. * 198 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cotacachi (SumaK Yachana Wasi), Santo Domingo (Min Inun Ya) y en Sangolqui (Colegio Juan Salinas) en coordinación con SIPROFE. * Primera fase finalizada de Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en 10 unidades Educativas de Milenio. * Inicio de Segunda Etapa de la Estrategia Integral AD-TIC (Aprendizaje desarrollador con Tecnología de la Información y Comunicación). * Emisión de lineamientos y criterios para la construcción y lanzamiento de la Plataforma de Gestión Educativa Educar-Ecuador. * 2088 Certificados en cursos TIC a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>02/01/2014 - 09:45 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MINEDUC-CNT * REVISIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EDUCATIVOS PARA LA PLATAFORMA DE SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR * PROYECTO LECTURA: Cierre de la evaluación pedagógica del proceso con UNIVERSALDIDACTICS. * Evaluación de los productos de DIGITAL LEARNING y BRITÁNICA. * SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS RECURSOS TIC con la Dirección Nacional de Currículo. * REELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN. * Intervención primera etapa: Levantamiento de la línea base y sensibilización en tres UEM (Cacique Tumbalá en Zumbahua, 5 de Junio, Macará, Loja y Técnica Experimental del Milenio, Ahuano, Tena). 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>03/12/2013 - 09:18 AM</p>
<p>OCTUBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Preparación para el lanzamiento del PORTAL, reuniones con la VVBO. * Informe viabilidad para el convenio CNT-MINEDUC, * Información complementaria a MINTEL para el equipamiento de computadoras a nivel nacional y Validación de instituciones beneficiarias del BI para equipamiento. * Mapeo de recursos TIC para todas las áreas del currículo en 7 de EGB, Revisión de los criterios de los validadores y ajustes de la propuesta del mapeo para 5 de EGB en todas las áreas y de 6 de EGB para Ciencias Naturales y Estudios Sociales. * Elaboración de la estrategia integral para facilitar con énfasis el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. * Propuesta del Taller de Acompañamiento Metodológico para la tercera etapa de intervención. * Certificación SiProfe en TIC I, de cuatro docentes de la DNTE. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>01/11/2013 - 02:28 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Intervención para el levantamiento de la línea base en el uso de las TIC, en el Colegio Juan de Salinas, de Quito. * Base de dato actualizada de los técnicos territoriales, los docentes de las ATC y de los docentes de los INFOCENTROS para la certificación en TIC I. * Elaboración de certificados del Curso TIC I y TIC II. * Elaboración de Cronograma de entrega de equipamiento a instituciones educativas para MINTEL * Elaboración de Cronograma de capacitación en TIC 1 y TIC 2 en instituciones educativas beneficiadas por MINTEL para Formación Continua. * Elaboración de Normas de Buenas Prácticas para los cursos a dictarse. * 20 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en la Unidad Educativa del Milenio Victor Dávalos. 		
<p>SEPTIEMBRE 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 120 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Alausi y 20 capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en coordinación con el SIPROFE. * TDR de plataforma Virtual del MINEDUC. * Presentación del proyecto piloto de 10.000 computadores para docentes realizada. * Nuevo interfaz de usuario de la plataforma virtual (link. virtual.educacion.gob.ec). * Listado final entregado a MINTEL para el equipamiento tecnológico. * Presentación del proyecto CORE de Gestión Educativa de Ministerio de Educación para consolidar los servicios tecnológicos a los docentes de la instituciones educativas realizada. * Certificación de 5 funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación como docentes SIPROFE para replicar capacitación en TIC. * Intervención de uso de TIC en la Unidad Educativa del Milenio Mi Inun Ya, Santo Domingo de los Tsáchilas en el proceso de enseñanza aprendizaje. * Matrices para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Ciencias Sociales, Ciencia Naturales, Matemáticas y Lengua de 5to año de EGB. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>04/10/2013 - 03:24 PM</p>
<p>AGOSTO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Construcción de la matriz para el mapeo de los recursos TIC. * Mapeo de los recursos TIC para las áreas: Ciencias Naturales, Matemática y Ciencias Sociales de 5to. año de EGB. * Validación de los técnicos territoriales de las políticas y lineamientos de equipamiento. * Informe estado del Proyecto CEIBAL. * Intervención a la UEM Sumak Yachana Wasi, de Cotocachi. * intervención a la UEM Alfredo Vera Vera, de Guayaquil en apoyo al equipo de la DNMP. * Rediseño de la plataforma virtual del MINEDUC. * Presentación del nuevo diseño del portal EDUCARECUADOR. * Presentación de ponencias en dos foros de la Asamblea Nacional: Asociación de Software Libre del Ecuador y Disminución de la brecha tecnológica en el Ecuador. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>03/09/2013 - 03:46 PM</p>
<p>JULIO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de los TDR para la Guía de oportunidades pedagógicas de TIC. * Revisión del portal educativo EducarEcuador. * Construcción del interfaz del portal educativo EducarEcuador. * Revisión de la agenda de la reunión de técnicos territoriales. * Procesamiento de información sobre la experiencia de los mejores a nivel internacional: Corea, Singapur y Finlandia. * Diagnóstico de la situación actual del Proyecto MI COMPU en Santa Elena y Cuenca. * Ejecución de la primera parte del curso de inducción en TIC a los docentes y directivos de la UEM Mi Inun Ya. * Desarrollo de la II Jornada de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación. * Elaboración de TDR para el curso de TIC 3. * Validación de 60 RDD para Educación Inicial y 1º de Educación General Básica. * Lanzamiento de la página web " Educa-Televisión para aprender". * Lineamientos de equipamiento tecnológico para instituciones educativas fiscales. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>05/08/2013 - 03:57 PM</p>
<p>JUNIO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaboración de formulario para ingreso de datos de los técnicos docentes. * Elaboración de TDR para la contratación de una consultoría dirigida al diseño y elaboración de guías del instructor y libros del docente para cursos proyectos educativos tecnológicos, desde primero hasta décimo de Educación General Básica. * Revisión de documentos para las decisiones de Tablets para contextos escolares. * Revisión de RDD de Educación Inicial. * Elaboración de propuesta para congreso con técnicos territoriales a realizarse en Quito. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>04/07/2013 - 08:42 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<ul style="list-style-type: none"> * Lineamientos de uso de TIC en el aula . * Aplicación de la ficha de evaluación de portales educativos. * Diseñar una propuesta de un modelo de capacitación de TIC en Educación. 		
<p>MAYO 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Políticas de uso de TICS en el aula. * Lineamientos y normas técnicas para la inclusión de las TIC en el aula. * Emisión de certificados de aprobación de los alumnos de aulas tecnológicas comunitarias, asistencia a eventos de clausura de ATC, constatación de los documentos recibidos del proyecto SITEC. * Plataforma Virtual con sugerencias para la implementación. * Revisión de RDD para inicial y primero de básica. * Construcción Interfaz del portal Educativo EducarEcuador. * Guía de observación a clase para la planificación micro curricular con énfasis en la introducción de las TIC. * TDR de la guía de oportunidades pedagógicas para TIC. 	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>05/06/2013 - 03:17 PM</p>
<p>ABRIL 2013:</p> <p>Reestructuración de la Dirección Nacional de Tecnologías para la educación, creación de políticas de uso de TICS en el aula, lineamientos y normas técnicas para la inclusión de las TIC en el aula, emisión de certificados de aprobación de los alumnos de aulas tecnológicas comunitarias, asistencia a eventos de clausura de ATC, constatación de los documentos recibidos del proyecto SITEC , informe final del proyecto mi compu, coordinación con MINTEL, reprogramación del PAI para cubrir pagos pendientes, revisión de RDD publicados, validación del portal educativo Educa-Ecuador, validación de la plataforma educativa desarrollado en moodle, elaboración de TDR para contratación de personal, revisión convenio telefónica, levantamiento de información latinoamericana para lineamientos de uso de tic en el aula, revisión de portales educativos de América latina, participación en la red de portales educativos RELPE (argentina), revisión de la consultoría de RDD para inicial y primero de básica modificación al contrato.</p>	<p>Cadena Vela, Susana Graciela</p>	<p>03/05/2013 - 04:21 PM</p>
<p>MARZO 2013</p> <p>Monitoreo y seguimiento a los levantamientos de información de los establecimientos educativos realizado por los técnicos territoriales a nivel nacional, elaboración informe para solicitar cambios al informe final de la evaluación del proyecto Mi Compu; reprogramación PAI para distribuir fondos asignados por Cooperación Internacional, elaboración informe de arrastres de los procesos contractuales del 2012 con antecedentes y estado actual; seguimiento y emisión de certificados de aprobación para los alumnos de las Aulas Tecnológicas Comunitarias, elaboración respuestas a solicitudes de planteles educativos y Presidencia que requieren equipamiento y conectividad; revisión de RDD de de 8vo a 10mo de básica de Lengua y Literatura y Matemáticas, levantamiento del inventario de los expedientes existentes en el proyecto.</p>	<p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p>	<p>03/04/2013 - 01:34 PM</p>
<p>FEBRERO 2013:</p> <p>Elaboración especificaciones técnicas de computadoras de escritorio, pizarra digita, proyectores de imagen, routers, switch, cables, reguladores de voltaje, impresoras y mobiliario para validación por parte de sistemas y posterior entrega a CNT; selección y envío de establecimientos que requerían adecuaciones físicas a la Subsecretaría de Administración Escolar; selección y envío a MINTEL de listado de establecimientos educativos que requieren conectividad; seguimiento al equipamiento entregado por MINTEL en los colegios 24 de Mayo, Mejía, Montúfar y Montalvo y elaboración de informes; selección y envío a las Coordinaciones Zonales el listado de establecimientos que requieren levantamientos de información; elaboración resumen ejecutivo e informe final de la evaluación del proyecto Mi Compu; solicitud certificaciones presupuestarias para mantenimiento de impresora, pago de pasajes aéreos y consultoría diseñador base de datos; elaboración cronograma de planificación anual de los procesos pendientes del proyecto; seguimiento y emisión de certificados de aprobación para los alumnos de las Aulas Tecnológicas Comunitarias, elaboración respuestas a solicitudes de planteles educativos que requieren equipamiento y conectividad; validación de RDD de de 8vo a 10mo de básica de Lengua y Literatura y Matemáticas.</p>	<p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p>	<p>05/03/2013 - 09:04 AM</p>
<p>ENERO 2013</p> <p>En enero de 2013 se realizaron las siguientes actividades: Finalización informe de gestión SITEC 2012 para planificación; Revisión, corrección y entrega de guía ATC; revisión guía de equipamiento tecnológico, y elaboración guía de proyecto MI COMPU; modificación de la guía metodológica de Contenidos Digitales; Configuración servidores de Mi Compu con los videos de Educa y los RD; revisión y corrección de temas y actividades para la consultoría para el diseño de RDD de inicial y 1ero de EGB para tablets; revisión RDD de ISSOLUCIONES; revisión de contenidos y presentación de la propuesta para el curso III a dictarse en las ATC; seguimiento de la contratación de responsables de ATC y</p>	<p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p>	<p>04/02/2013 - 05:09 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>técnicos territoriales; seguimiento curso en línea onlinesoft ; alimentación base de datos de los levantamientos de información realizados a los establecimientos educativos; Elaboración de listado de 721 establecimientos educativos listos para ser beneficiados con equipamiento tecnológico por MINTEL; Seguimiento a la justificación técnica del proyecto TABLETS; seguimiento a la respuesta de sistemas de la aprobación del ancho de banda y líneas telefónicas de las UEM; Seguimiento al equipamiento de las UEM Tarqui y Amauta Ñan y Colegios Réplicas.</p>		
<p>DICIEMBRE 2012: En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: Seguimiento trámite aprobación de especificaciones técnicas para las tablets; seguimiento trámite para aprobación de especificaciones técnicas para las Unidades Educativas del Milenio; seguimiento trámite revisión de ficha o formato para levantamiento de información solicitado; Revisión listados de establecimientos asignados a los procesos de contratación de MINTEL; gestión del proceso de compras públicas CDC-MINEDU-174-2012, apertura de sobre proceso CDC-MINEDU-174-2012 y elaboración de informe de calificación; elaboración y envío del informe de las Unidades Educativas del Milenio que están en construcción y que fueron visitadas; Elaboración Informes para reunión con CNT sobre establecimientos educativos para ser equipados; elaboración respuesta de acciones tomadas para cumplir las recomendaciones de contraloría; coordinación envío de servidores a las Coordinaciones Zonales 5 y 6; revisión guía metodológica de ATC; Guía metodológica de Contenidos Digitales, elaboración fichas metodológicas de Lengua y Literatura de 2do a 10mo de educación general básica, elaboración fichas de las animaciones de las leyendas en kichwa y español. Guía metodológica de MI COMPU; Guía metodológica Equipamiento; informe de gestión anual; planificación contrataciones 2013.</p>	<p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p>	<p>05/01/2013 - 12:47 PM</p>
<p>Noviembre: Validación RDD de lengua y literatura de 2do. a 7mo. de básica Don Bosco y animaciones de Consultora Fabara; fichas metodológicas de lengua y literatura de 2do. a 7mo, guía metodológica y guión literario animaciones en dos idiomas kichwa y español, elaboración TDR e infome técnico contenidos inicial y 1ero año EGB, capacitación técnica y pedagógica a docentes y alumnos de la UEM Rodrigo Ríofrío uso de RDD, revisión y corrección con SIPROFE del informe Plan Ceibal, seguimiento entrega informe de evaluación Cimacyt, seguimiento software anti robo para servidores, seguimiento elaboración acta final de routers, emisión certificados ATC, envío a autoridades informe para apertura ATC, revisión y consolidación fichas de levantamiento de información, elaboración de propuesta actualización de especificaciones técnicas, elaboración propuesta arquitectura de tablets, actualización estándares unidades educativas del milenio.</p>	<p>Silva Helguero, Saskia Lorena</p>	<p>05/12/2012 - 10:06 AM</p>
<p>AVANCE 2012 - Octubre: Corrección de los RDD, Don Bosco e IS Soluciones y animaciones; fichas metodológicas en kichwa, informe propuesta tablets BI, elaboración TDR e infome técnico contenidos inicial y 1ero año EGB, informe técnico Plan Ceibal, seguimiento software anti robo para servidores. trámite pago final Otecel, Insoltek e ISSoluciones, emisión certificados ATC, análisis establecimientos educativos que cumplan las disposiciones para abrir ATC, revisión y consolidación fichas de levantamiento de información, continúa entrega routers. - Septiembre: Revisión de contenidos de OTECEL, información de UEM para propuesta tablets 1ero Bachillerato, elaboración y revisión de guía redes sociales, elaboración temas revista "educar" , elaboración propuesta tablets 1eo y 2do BI, revisión propuesta contenidos tablets, taller inducción técnicos territoriales, entrega routers y coordinación entrega 21 laptops para docentes. Seguimiento listados de levantamiento de información de planteles y adecuaciones físicas, revisión informes PLAN CEIBAL y CIMACYT. Coordinación pago OTECEL e INSOLTEK. - Agosto: Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD, revisión y corrección de las animaciones en kichwa elaboración propuesta tablets, análisis de software libre para inicial, seguimiento contratación técnicos territoriales, coordinación revisiones técnicas servidores, routers, proyectores. Seguimiento transferencia adecuaciones coordinaciones zonales, seguimiento coordinaciones zonales por el levantamiento de verificación. - Julio: Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD, elaboración TDR de nuevos cursos para capacitación docente, seguimiento contratación técnicos territoriales, elaboración de certificados de nivel básico y medio para los beneficiados de los cursos. - Junio: Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de, Lengua y Literatura de 2.º a 7.º ; Validación de RDD de Matemática. Elaboración informe justificación para producir RDD de Ciencias Naturales y Sociales. Elaboración TDR contratación especialistas y cursos CMI e Infopedagogía. Elaboración instructivo contratación técnicos en territorio. Seguimiento transferencia a coordinaciones zonales. - Mayo: Coordinación taller de sensibilización proyecto MI COMPU con el Plan Ceibal. Entrega de laptops de estudiantes a las instituciones beneficiarias de la Libertad. Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de, Lengua y Literatura de 2.º a 7.º ; Validación de RDD de Matemática.</p>	<p>Luna Estrella, Leandro Andrés</p>	<p>16/11/2012 - 09:01 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>- Abril: Coordinación con la Dirección de Tecnología para la adquisición de laptops para docentes del Proyecto MI COMPU en la libertad; Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de Lengua y Literatura de 2.º a 7.º; Validación de RDD de Matemática.</p> <p>-Marzo: Informes técnicas de BAYTEC-HIDROPLAN; Coordinación de talleres de validación y revisión técnica y pedagógica de RDD del proceso LCC-MINEDU-49A-2011, del área de Matemática, Lengua y Literatura de 8vo a 10mo; Elaboración de certificados de nivel básico y medio para los beneficiados de los cursos.</p> <p>- Febrero: Coordinación con MINTEL para la entrega de equipamiento tecnológico en planteles educativos; Seguimiento al proceso de contratación de 153 routers y 26 servidores 63 proyectores; Corrección pedagógica, técnica y de estilo de los RDD de Matemática, Lengua y Literatura de 2.º a 7.º; Validación de RDD de Matemática de 2.º a 7.º; Elaboración de certificados de nivel básico y medio para los beneficiados de los cursos; Coordinación y seguimiento con las Direcciones Provinciales para la contratación de responsables de aula.</p> <p>AL FINAL DEL AÑO 2011, SE COMUNICA AL PROYECTO QUE YA NO ES DE SU COMPETENCIA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ASI COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL EDUCATIVO.</p>		

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. El retraso en la aprobación del Dictamen de Actualización del Proyecto SITEC para el periodo 2010 - 2017 CAUSARIA inconvenientes en la gestión del proyecto</p>	17/06/2015		50 %	50	25	3/5

Riesgos cerrados: 11, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN. Proyecto autorizado por SENPLADES (Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad).	1-Solicitud de Información	15/03/2010		15/03/2010		Sí	10.0
2	PLANIFICACIÓN. Definición de plan de trabajo, presupuesto asignado y plan definido.	Z - Compromiso Ministerial	15/12/2010		15/12/2010		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN. 350 Aulas tecnológicas en establecimientos educativos en el 2010 implementadas.	9-Entregables Formales	31/12/2010		31/12/2010		Sí	0.25
4	EJECUCIÓN. Desarrollo de 60 paquetes de recursos educativos didácticos digitales en el 2010 adquiridos.	9-Entregables Formales	31/12/2010		31/12/2010		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCIÓN. Paquetes de recursos educativos didácticos digitales entregados.	1-Solicitud de Información	31/01/2011		31/01/2011		Sí	0.25
6	EJECUCIÓN. Contrato de levantamiento de infraestructura física y tecnológica de los establecimientos educativos en la situación actual y fiscalizados 2010-2011 firmado.	4-Inicio de Trabajo	24/02/2011		24/02/2011		Sí	0.25
7	EJECUCIÓN. 40 Aulas Tecnológicas Comunitarias en febrero 2010 aperturadas.	9-Entregables Formales	28/02/2011		28/02/2011		Sí	0.25
8	EJECUCIÓN. En el portal EducarEcuador 1.018 contenidos catalogados.	9-Entregables Formales	18/03/2011		18/03/2011		Sí	0.25
9	EJECUCIÓN. Pliegos para compra de equipamiento para niños - Mi Compu finalizado.	2-Publicación de Pliegos	21/03/2011		21/03/2011		Sí	0.25
10	EJECUCIÓN. 46 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Marzo aperturadas.	9-Entregables Formales	31/03/2011		31/03/2011		Sí	0.25
11	EJECUCIÓN. Contrato para desarrollo de Recursos didácticos digitales en español firmado.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2011		31/03/2011		Sí	0.25
12	EJECUCIÓN. Compra de equipamiento para docentes- Mi Compu adjudicado.	3-Adjudicación	14/04/2011		14/04/2011		Sí	0.25
13	EJECUCIÓN. Compra de equipamiento para estudiantes- Mi Compu adjudicado.	3-Adjudicación	15/04/2011		15/04/2011		Sí	0.25
14	EJECUCIÓN. 13 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Abril aperturadas.	9-Entregables Formales	29/04/2011		29/04/2011		Sí	0.25
15	EJECUCIÓN. 25 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Mayo aperturadas.	9-Entregables Formales	31/05/2011		31/05/2011		Sí	0.25
16	EJECUCIÓN. Transferencia de recursos para pre adecuaciones físicas campamentos temporales realizada.	4-Inicio de Trabajo	28/06/2011		28/06/2011		Sí	0.25
17	EJECUCIÓN. 19 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Junio aperturadas.	9-Entregables Formales	30/06/2011		30/06/2011		Sí	0.25
18	EJECUCIÓN. 20 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Julio aperturadas.	9-Entregables Formales	12/07/2011		12/07/2011		Sí	0.25
19	EJECUCIÓN. Entrega de certificados de terminación de cursos ATC primer semestre año 2011 finalizado.	9-Entregables Formales	05/08/2011		05/08/2011		Sí	0.25
20	EJECUCIÓN. Participación concurso Aulas Hermanas finalizada.	5-Entregables Intermedios	05/08/2011		05/08/2011		Sí	0.25
21	EJECUCIÓN. 30 Aulas Tecnológicas Comunitarias en Agosto aperturadas.	9-Entregables Formales	31/08/2011		31/08/2011		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN. Elaboración de TDRs para compra de equipamiento tecnológico finalizado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2011		15/09/2011		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN. Proceso de adquisición de equipamiento tecnológico para establecimientos beneficiarios (1.181 computadoras) iniciado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2011		15/09/2011		Sí	0.25
24	EJECUCIÓN. Elaboración de 70 recursos didácticos finalizados.	9-Entregables Formales	26/09/2011		26/09/2011		Sí	0.25
25	EJECUCIÓN. Propuesta de temas de alfabetización digital para la comunidad planteada.	5-Entregables Intermedios	07/10/2011		07/10/2011		Sí	0.25
26	EJECUCIÓN. Equipamiento a establecimientos de proyecto Coca Codo Sinclair entregado.	9-Entregables Formales	28/10/2011		28/10/2011		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN. Consultoría para sensibilización - Mi Compu adjudicado.	3-Adjudicación	28/11/2011		28/11/2011		Sí	0.25
28	EJECUCIÓN. Laptops a docentes en Cuenca - MI COMPU entregadas.	9-Entregables Formales	09/12/2011		09/12/2011		Sí	0.25
29	EJECUCIÓN. Capacitación a docentes curso I - MI COMPU finalizado.	9-Entregables Formales	16/12/2011		16/12/2011		Sí	0.25
30	EJECUCIÓN. Capacitación a docentes curso II - MI COMPU finalizado.	9-Entregables Formales	23/12/2011		23/12/2011		Sí	0.25
31	EJECUCIÓN. Laptops para estudiantes - Mi Compu entregadas.	9-Entregables Formales	02/01/2012		02/01/2012		Sí	0.25
32	EJECUCIÓN. Curso de TIC para docentes del magisterio fiscal a cargo de Siprofe iniciado.	4-Inicio de Trabajo	07/01/2012		07/01/2012		Sí	0.25
33	EJECUCIÓN. Informe final del levantamiento de infraestructura física y tecnológica de los establecimientos educativos en la situación actual y fiscalizados finalizado 2010-2011. finalizado.	5-Entregables Intermedios	24/02/2012		24/02/2012		Sí	0.25
34	EJECUCIÓN. Curso de TIC para docentes del magisterio fiscal finalizado.	9-Entregables Formales	02/03/2012		02/03/2012		Sí	0.25
35	EJECUCIÓN. Evaluación del Curso de TIC para docentes del magisterio fiscal finalizado.	9-Entregables Formales	09/03/2012		09/03/2012		Sí	0.25
36	EJECUCIÓN. Laptops a docentes y estudiantes en La Libertad - MI COMPU entregadas.	9-Entregables Formales	04/05/2012		04/05/2012		Sí	0.25
37	EJECUCIÓN. 150 contenidos digitales educativos elaborados.	9-Entregables Formales	05/12/2012		05/12/2012		Sí	0.25
38	EJECUCIÓN. Solicitud de fondos para continuar	1-Solicitud de Información	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ejecución de arrastres 2012 gestionados.							
39	PLANIFICACIÓN. Actividades para el primer semestre 2013 planificadas.	1-Solicitud de Información	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.25
40	EJECUCIÓN. Entrega administrativamente de equipos y archivos del SITEC a la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación transferidos.	1-Solicitud de Información	15/05/2013		15/05/2013		Sí	0.25
41	EJECUCIÓN. Clase metodológica para la planificación micro curricular con énfasis en la introducción de las TIC presentada.	1-Solicitud de Información	17/05/2013		17/05/2013		Sí	0.25
42	EJECUCIÓN. Propuesta de mejoramiento para el curso de inducción SIPROFE elaborada.	1-Solicitud de Información	23/05/2013		23/05/2013		Sí	0.25
43	EJECUCIÓN. Fichas de levantamiento de información para automatizar información de infraestructura tecnológica en un 30% elaboradas.	1-Solicitud de Información	25/05/2013		25/05/2013		Sí	0.25
44	EJECUCIÓN. Procesar y levantar información relacionada con las TIC, a nivel extranjero y nacional finalizado.	1-Solicitud de Información	28/05/2013		28/05/2013		Sí	0.25
45	EJECUCIÓN. Construir Interfaz del portal educativo EducarEcuador finalizado.	1-Solicitud de Información	29/05/2013		29/05/2013		Sí	0.25
46	EJECUCIÓN. Guía de observación a clase para la planificación micro curricular con énfasis en la inducción de las TIC. elaborada.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
47	EJECUCIÓN. Informe final CIMACYT elaborado.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
48	EJECUCIÓN. Instrumentos de evaluación para el proyecto MI COMPU (docentes, estudiantes, padres de familia, técnicos TIC) elaborados.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
49	EJECUCIÓN. Procesos involucrados en equipamiento de TIC desarrollados.	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
50	EJECUCIÓN. Propuesta del modelo educativo para el reforzamiento de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje elaborada.	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
51	EJECUCIÓN. Términos de referencia de la Guía de oportunidades pedagógicas para TIC elaborados.	1-Solicitud de Información	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
52	EJECUCIÓN. Proyecto Mi COMPU, en las instituciones del Cantón la Libertad implementado.	1-Solicitud de Información	06/06/2013		06/06/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
53	EJECUCIÓN. Uso de TIC en el aula, escuela Braulia Franco socializados.	1-Solicitud de Información	07/06/2013		07/06/2013		Sí	0.25
54	EJECUCIÓN. Proyecto Mi COMPU, en las instituciones del Cánton Cuenca implementado.	1-Solicitud de Información	13/06/2013		13/06/2013		Sí	0.25
55	EJECUCIÓN. Documentos para las decisiones de Tablets para contextos escolares elaborados.	1-Solicitud de Información	14/06/2013		14/06/2013		Sí	0.25
56	EJECUCIÓN. Formulario para ingreso de datos de los técnicos docentes elaborado.	1-Solicitud de Información	14/06/2013		14/06/2013		Sí	0.25
57	EJECUCIÓN. RDD de Educación Inicial por parte de Expresion revisados.	1-Solicitud de Información	14/06/2013		14/06/2013		Sí	0.25
58	EJECUCIÓN. TDR para la contratación de una consultoría dirigida al diseño y elaboración de guías del instructor y libros del docente para cursos proyectos educativos tecnológicos, desde primero hasta décimo de Educación General Básica elaborados.	1-Solicitud de Información	14/06/2013		14/06/2013		Sí	0.25
59	EJECUCIÓN. Lineamientos de equipamiento tecnológico para instituciones educativas fiscales elaborados.	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	0.25
60	EJECUCIÓN. Propuesta para congreso con técnicos territoriales a realizarse en Quito elaborada.	1-Solicitud de Información	15/06/2013		15/06/2013		Sí	0.25
61	EJECUCIÓN. Aplicación de la ficha de evaluación de portales educativos finalizada.	1-Solicitud de Información	25/06/2013		25/06/2013		Sí	0.25
62	EJECUCIÓN. Propuesta de un modelo de capacitación de TIC en Educación diseñada.	1-Solicitud de Información	26/06/2013		26/06/2013		Sí	0.25
63	EJECUCIÓN. Inducción de uso de TIC en la Unidad Educativa del Milenio Mi Inun Ya, Santo Domingo de los Tsáchilas iniciada.	1-Solicitud de Información	08/07/2013		08/07/2013		Sí	0.25
64	EJECUCIÓN. TDR para la elaboración del curso de TIC nivel 3 elaborados.	1-Solicitud de Información	08/07/2013		08/07/2013		Sí	0.25
65	EJECUCIÓN. Fichas de levantamiento de información para automatizar información de infraestructura tecnológica al 100% finalizadas.	1-Solicitud de Información	15/07/2013		15/07/2013		Sí	0.25
66	EJECUCIÓN. Recursos económicos a la Coordinación Zonal 8 por un valor de \$ 463.152,74 para contratos de adecuaciones de las ATC transferidos.	1-Solicitud de Información	18/07/2013		18/07/2013		Sí	0.25
67	EJECUCIÓN. Participación en la II jornada de la Dirección	1-Solicitud de Información	19/07/2013		19/07/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Nacional de Tecnologías para la Educación finalizada.							
68	EJECUCIÓN. Validación de 40 contenidos digitales educativos para 1° de Educación General Básica finalizada.	1-Solicitud de Información	25/07/2013		25/07/2013		Sí	0.25
69	EJECUCIÓN. Revisión de lineamientos para proceso de entrega de listados a MINTEL. finalizada.	1-Solicitud de Información	26/07/2013		26/07/2013		Sí	0.25
70	EJECUCIÓN. Validación de 20 contenidos digitales educativos para Educación Inicial finalizada.	1-Solicitud de Información	26/07/2013		26/07/2013		Sí	0.25
71	EJECUCIÓN. Borrador de Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Ciencias Naturales de 5to año de EGB elaborada.	1-Solicitud de Información	09/08/2013		09/08/2013		Sí	0.25
72	EJECUCIÓN. Diseño de interfaz de la plataforma virtual (link: virtual.educacion.gob.ec) finalizado.	1-Solicitud de Información	15/08/2013		15/08/2013		Sí	0.25
73	EJECUCIÓN. Presentación de ponencias en el foro de la Asamblea Nacional: Asociación de Software libre con el Tema "Ciudadanos Digitales" realizada.	1-Solicitud de Información	20/08/2013		20/08/2013		Sí	0.25
74	EJECUCIÓN. Segundo listado entregado a MINTEL validado.	1-Solicitud de Información	25/08/2013		25/08/2013		Sí	0.25
75	EJECUCIÓN. Presentación de ponencias en el foro de la Comisión de Educación con el tema "Aporte de uso de TIC para EGB y BGU" realizada.	1-Solicitud de Información	28/08/2013		28/08/2013		Sí	0.25
76	EJECUCIÓN. 1638 Certificados de Cursos digitados en las ATC elaborados y entregados.	1-Solicitud de Información	30/08/2013		30/08/2013		Sí	0.25
77	EJECUCIÓN. 120 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Alausi en coordinación con el SIPROFE finalizado.	1-Solicitud de Información	05/09/2013		05/09/2013		Sí	0.25
78	EJECUCIÓN. TDR de plataforma Virtual del MINEDUC realizado.	1-Solicitud de Información	05/09/2013		05/09/2013		Sí	0.25
79	EJECUCIÓN. Presentación del proyecto piloto de 10.000 computadores para docentes realizada.	1-Solicitud de Información	09/09/2013		09/09/2013		Sí	0.25
80	EJECUCIÓN. Nuevo interfaz de usuario de la plataforma virtual (link. virtual.educacion.gob.ec) finalizado.	1-Solicitud de Información	10/09/2013		10/09/2013		Sí	0.25
81	EJECUCIÓN. Listado final a MINTEL para el equipamiento tecnológico entregado.	1-Solicitud de Información	19/09/2013		19/09/2013		Sí	0.25
82	EJECUCIÓN. Presentación del proyecto CORE de Gestión	1-Solicitud de Información	23/09/2013		23/09/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Educativa de Ministerio de Educación para consolidar los servicios tecnológicos a los docentes de la instituciones educativas realizada.							
83	EJECUCIÓN. 20 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en coordinación con el SIPROFE finalizado.	1-Solicitud de Información	27/09/2013		27/09/2013		Sí	0.25
84	EJECUCIÓN. Certificación de 5 funcionarios de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación como docentes SIPROFE para replicar capacitación en TIC 1 finalizado.	1-Solicitud de Información	27/09/2013		27/09/2013		Sí	0.25
85	EJECUCIÓN. Intervención de uso de TIC en la Unidad Educativa del Milenio Mi Inun Ya, Santo Domingo de los Tsáchilas en el proceso de enseñanza aprendizaje realizada.	1-Solicitud de Información	27/09/2013		27/09/2013		Sí	0.25
86	EJECUCIÓN. Borrador Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Ciencias Sociales de 5to año de EGB elaborada.	1-Solicitud de Información	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.25
87	EJECUCIÓN. Borrador Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Lengua de 5to año de EGB elaborada.	1-Solicitud de Información	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.25
88	EJECUCIÓN. Borrador Matriz para seleccionar los recursos digitales asociados al círculo de Matemáticas de 5to año de EGB elaborada.	1-Solicitud de Información	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.25
89	EJECUCIÓN. Cronograma de entrega de equipamiento a instituciones educativas para MINTEL elaborado.	1-Solicitud de Información	04/10/2013		04/10/2013		Sí	0.25
90	EJECUCIÓN. Cronograma de capacitación en TIC 1 y TIC 2 en instituciones educativas beneficiadas por MINTEL para Formación Continua elaborado.	1-Solicitud de Información	07/10/2013		07/10/2013		Sí	0.25
91	EJECUCIÓN. Normas de Buenas Prácticas para los cursos a dictarse elaboradas.	1-Solicitud de Información	11/10/2013		11/10/2013		Sí	0.25
92	EJECUCIÓN. 20 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cuyabeno en la Unidad Educativa del Milenio Victor Dávalos finalizado.	1-Solicitud de Información	16/10/2013		16/10/2013		Sí	0.25
93	EJECUCIÓN. Informe Técnico para Plataforma de Servicio realizado.	9-Entregables Formales	12/11/2013		12/11/2013		Sí	0.25
94	EJECUCIÓN. Plataforma de Servicios Educativos (Firma de Convenio Interinstitucional	Z - Compromiso Ministerial	12/11/2013		12/11/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	entre MINEDUC-CNT) ANEXO 001 realizado.							
95	EJECUCIÓN. Coordinación con Formación Continua de cursos virtuales de TIC 1 y TIC II finalizado.	1-Solicitud de Información	15/11/2013		15/11/2013		Sí	0.25
96	EJECUCIÓN. Virtualización de curso "Formador de Formadores" realizado.	1-Solicitud de Información	18/11/2013		18/11/2013		Sí	0.25
97	EJECUCIÓN. Virtualización TIC 1 realizado.	1-Solicitud de Información	18/11/2013		18/11/2013		Sí	0.25
98	EJECUCIÓN. Virtualización TIC 2 realizado.	1-Solicitud de Información	18/11/2013		18/11/2013		Sí	0.25
99	EJECUCIÓN. Guía didáctica de contenidos para dictar cursos en las ATC elaborada.	9-Entregables Formales	12/12/2013		12/12/2013		Sí	0.25
100	EJECUCIÓN. Capacitación 36 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Cotacachi en coordinación con SIPROFE finalizada.	1-Solicitud de Información	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.25
101	EJECUCIÓN. Capacitación 38 docentes capacitados en curso de TIC 1 en Santo Domingo en coordinación con Siprofe finalizada.	1-Solicitud de Información	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.25
102	EJECUCIÓN. Capacitación de 124 docentes en curso de TIC 1 en el Colegio Juan Salinas en coordinación con SIPROFE finalizada.	1-Solicitud de Información	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.25
103	EJECUCIÓN. Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en unidades de Milenio, Primera Fase finalizado.	1-Solicitud de Información	27/12/2013		27/12/2013		Sí	0.25
104	EJECUCIÓN. Implementación de la plataforma virtual "virtual.educacion.gob.ec" realizada.	1-Solicitud de Información	23/01/2014		23/01/2014		Sí	0.25
105	EJECUCIÓN. Encuentro de Inducción y Designación de responsabilidades para la Implementación de la Plataforma de Servicios Educar Ecuador realizado.	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.25
106	EJECUCIÓN. Capacitación de 49 docentes en curso de TIC 1 en la Unidad Educativa Bicentenario finalizada.	1-Solicitud de Información	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.25
107	EJECUCIÓN. Capacitación de 70 docentes en curso de TIC 1 en la Unidad Educativa Bicentenario Municipal finalizada.	1-Solicitud de Información	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.25
108	EJECUCIÓN. Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en la Unidad Educativa Bicentenario, finalizado.	1-Solicitud de Información	15/02/2014		15/02/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
109	EJECUCIÓN. Capacitación virtual con 3 sesiones presenciales a 1183 docentes de 15 unidades educativas de la provincia de Pichincha iniciada.	4-Inicio de Trabajo	17/02/2014		17/02/2014		Sí	0.25
110	EJECUCIÓN. Levantamiento de línea base de conocimientos TIC a docentes en la Unidad Educativa Hidrobo, finalizado.	1-Solicitud de Información	20/02/2014		20/02/2014		Sí	0.25
111	EJECUCIÓN. Creación de mapeos de Ciencias Sociales y Lengua para octavo año de educación general básica (9 RDD de ciencias sociales y 28 RDD de lengua) finalizado	1-Solicitud de Información	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.25
112	EJECUCIÓN. Creación de menús (11 de matemáticas, 11 de lengua, 6 de ciencias sociales, 6 de ciencias naturales.) para la plataforma EducaEcuador realizado.	1-Solicitud de Información	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.25
113	EJECUCIÓN. 2364 docentes en proceso de capacitación en cursos TIC 1 a través del programa Comunidad Educativa en Línea en la Plataforma EducarEcuador en un total de 41 Instituciones Educativas iniciado.	1-Solicitud de Información	17/03/2014		17/03/2014		Sí	0.25
114	EJECUCIÓN. Certificación de 10 docentes como docentes SIPROFE para replicar conocimientos en ATC finalizado	1-Solicitud de Información	20/03/2014		20/03/2014		Sí	0.25
115	EJECUCIÓN. Clasificación de RDD por destrezas, aéreas y años de educación general básica y el levantamiento de la información a la plataforma EducarEcuador elaborada.	5-Entregables Intermedios	20/03/2014		20/03/2014		Sí	0.25
116	EJECUCIÓN. Manual para uso de las Aulas Tecnológicas Comunitarias elaborado.	5-Entregables Intermedios	26/03/2014		26/03/2014		Sí	0.25
117	EJECUCIÓN. Guía metodológica de vinculación comunitaria para la gestión en las Aulas Tecnológicas Comunitarias DNTE elaborada.	5-Entregables Intermedios	28/03/2014		28/03/2014		Sí	0.25
118	EJECUCIÓN. 65 Instituciones educativas sensibilizadas a través del equipo de las Coordinaciones zonales para la creación de la comunidad de aprendizaje beneficiadas del programa "Comunidad Educativa en línea" iniciada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.25
119	EJECUCIÓN. Creación de claves y contraseñas a 3022 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector entregadas (Enero-Marzo).	9-Entregables Formales	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
120	EJECUCIÓN. 1210 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 15 Instituciones Educativas finalizado. (Enero-Marzo)	9-Entregables Formales	11/04/2014		11/04/2014		Sí	0.25
121	EJECUCIÓN. 6998 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias que se determinan a través de lineamientos de selección y políticas del Ministerio de Educación entregados.	9-Entregables Formales	28/04/2014		28/04/2014		Sí	0.25
122	EJECUCIÓN. 1681 docentes capacitados en cursos TIC 1 a través de la plataforma Educar-Ecuador en un total de 19 Instituciones Educativas finalizado. (Abril)	5-Entregables Intermedios	29/04/2014		29/04/2014		Sí	0.25
123	EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 10 EGB en Ciencias Naturales y Matemática elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2014		29/04/2014		Sí	0.25
124	EJECUCIÓN. Creación de claves y contraseñas a 765 usuarios en plataforma, acceso a tics y plan lector entregadas (Abril).	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.25
125	EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en la zona 3 e inicio de dos comunidades de aprendizaje en las UEM Penipe y Guano realizada.	9-Entregables Formales	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.25
126	EJECUCIÓN. Inducción de 1958 personas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias finalizado.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.25
127	EJECUCIÓN. TDR e informe técnico para la elaboración de un recurso digital del idioma Shuar aprobado.	5-Entregables Intermedios	09/05/2014		09/05/2014		Sí	0.25
128	EJECUCIÓN. Inducción de 1738 personas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de mayo finalizado.	5-Entregables Intermedios	29/05/2014		29/05/2014		Sí	0.25
129	EJECUCIÓN. 1854 docentes que recibieron equipamiento tecnológico en las instituciones beneficiarias de la primera etapa de Comunidad Educativa en Línea entregados.	5-Entregables Intermedios	29/05/2014		29/05/2014		Sí	0.25
130	EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 4 EGB de Ciencias Naturales y Mapeo de 10 EGB para Sociales elaborado.	1-Solicitud de Información	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
131	EJECUCIÓN. Segunda etapa de la comunidad de aprendizaje iniciada.	1-Solicitud de Información	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.25
132	EJECUCIÓN. Usuarios: 585 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector.	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	0.25
133	EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 4 EGB de las 3 áreas y Mapeo para 10 EGB para Lengua y Literatura elaborado.	5-Entregables Intermedios	16/06/2014		16/06/2014		Sí	0.25
134	EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 3 EGB de Entorno Natural y Social elaborado.	1-Solicitud de Información	29/06/2014		29/06/2014		Sí	0.25
135	EJECUCIÓN. Continuación de la avanzada en capacitación Plan Lector iniciada	1-Solicitud de Información	29/06/2014		29/06/2014		Sí	0.25
136	EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en la zona 9 e inicio de la comunidad de aprendizaje en la Unidad Educativa Réplica 24 de Mayo finalizada.	1-Solicitud de Información	29/06/2014		29/06/2014		Sí	0.25
137	EJECUCIÓN. 1851 personas alfabetizadas de la comunidad educativa en cursos TIC 1 a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de junio finalizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.25
138	EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 2 EGB para las tres áreas elaborado.	1-Solicitud de Información	30/07/2014		30/07/2014		Sí	0.25
139	EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 1 y 2 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada.	1-Solicitud de Información	30/07/2014		30/07/2014		Sí	0.25
140	EJECUCIÓN. Programa de capacitación, docentes preparados en el curso FORMADORES DE FORMADORES finalizado.	1-Solicitud de Información	30/07/2014		30/07/2014		Sí	0.25
141	EJECUCIÓN. Inducción de 4.539 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de julio finalizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.25
142	EJECUCIÓN. Usuarios: 819 Docentes con claves y contraseñas para utilización de plataforma EducarEcuador, acceso a tics y plan lector de la Etapa "SEMILLERO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA" finalizado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
143	EJECUCIÓN. Análisis de recursos para 1 DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO elaborado.	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.5
144	EJECUCIÓN. Socialización a docentes de 9 instituciones educativas referentes para la utilización de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula. iniciado.	1-Solicitud de Información	29/08/2014		29/08/2014		Sí	0.5
145	EJECUCIÓN. Inducción de 3.704 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de agosto finalizado.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	0.5
146	EJECUCIÓN. Taller de uso de la plataforma NEARPOD para implementación de herramientas tecnológicas en el aula dirigido a 40 docentes entre Técnicos Territoriales y personal de planta central con la finalidad de replicar a nivel nacional, finalizado.	5-Entregables Intermedios	03/09/2014		03/09/2014		Sí	0.5
147	EJECUCIÓN. Estrategia de sostenibilidad del PCEL en las zonas 6 y 7 e inicio de una comunidad de aprendizaje al menos en cada zona finalizada.	1-Solicitud de Información	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.5
148	EJECUCIÓN. Inducción de 1.193 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de septiembre finalizado.	1-Solicitud de Información	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.5
149	EJECUCIÓN. Propuesta para el uso de tecnologías en el aula, elaborada.	4-Inicio de Trabajo	30/10/2014		30/10/2014		Sí	0.5
150	EJECUCIÓN. Estructura externa para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR, diseñada.	4-Inicio de Trabajo	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.5
151	EJECUCIÓN. Estructura interna para el acceso a recursos digitales de la plataforma EDUCAR ECUADOR, diseñada.	4-Inicio de Trabajo	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.5
152	EJECUCIÓN. Inducción de 2361 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de octubre finalizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
153	EJECUCIÓN. Documento de reformulación del proyecto hasta el 2017 para la aprobación de las autoridades elaborado.	5-Entregables Intermedios	10/11/2014		10/11/2014		Sí	0.5
154	EJECUCIÓN. Inducción de 2322 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de noviembre finalizado.	1-Solicitud de Información	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.5
155	EJECUCIÓN. Análisis de recursos didácticos digitales para tabletas educativas para los estudiantes de segundo y quinto de básica elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	0.5
156	EJECUCIÓN. Inducción de 3032 personas de la comunidad educativa en cursos de alfabetización digital básica y avanzada a través de las Aulas Tecnológicas Comunitarias en el mes de diciembre finalizado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2014		30/12/2014		Sí	0.5
157	EJECUCIÓN. Análisis de 88 recursos para EGB de Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Educación Inicial. elaborado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2014		30/12/2014		Sí	2.5
158	EJECUCIÓN. Reformulación de Proyecto SITEC para transferencia de Proyecto, documento presentado.	9-Entregables Formales	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.25
159	EJECUCIÓN. Dictamen de ampliación del proyecto "Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad" hasta el 2017 SENPLADES. Gestionado.	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.25
160	EJECUCIÓN. Presentado la reformulación del Proyecto SITEC a la Dirección Nacional de Planificación Técnica	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.25
161	EJECUCIÓN: Distribución de líderes de zona y técnicos distritales a las 9 Coordinaciones Zonales enviado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.25
162	EJECUCIÓN: Presupuesto aprobado para la gestión del proyecto en el año 2015	1-Solicitud de Información	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.25
163	EJECUCIÓN: Programación del PAI elaborado	1-Solicitud de Información	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.25
164	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos a las 9 Coordinaciones Zonales para la contratación de 9 líderes zonales y 97 técnicos distritales SITEC enviado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
165	EJECUCIÓN: Control, seguimiento y verificación de la generación de usuarios y contraseñas de rectores en 1102 instituciones educativas de sostenimiento fiscal régimen costa elaborado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
166	EJECUCIÓN: Registro de docentes por parte de los rectores en cada institución educativa elaborado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
167	EJECUCIÓN: Registro de docentes por parte de los rectores en cada institución educativa elaborado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015	01/12/2015			No	1.25
168	EJECUCIÓN: Registro de estudiantes de instituciones educativas con más de 500 estudiantes en régimen costa planificado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	2.0
169	EJECUCIÓN: Registro de notas por parte de docentes en las instituciones con más de 500 estudiantes régimen costa	5-Entregables Intermedios	30/04/2015	30/07/2015			No	2.0
170	EJECUCIÓN: Registro de estudiantes de instituciones educativas con más de 500 estudiantes en régimen sierra planificado	5-Entregables Intermedios	31/05/2015	31/05/2015			No	2.0
171	EJECUCIÓN: Registro de notas por parte de docentes en las instituciones con más de 500 estudiantes régimen sierra planificado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015	30/06/2015			No	2.0
172	EJECUCIÓN. Aprobado el dictamen de actualización del Proyecto SITEC	5-Entregables Intermedios	31/07/2015	31/07/2015			No	1.5
173	EJECUCIÓN: Registro de insituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, fiscomisional, registro de estudiantes y registro de notas, planificado	5-Entregables Intermedios	31/07/2015	31/07/2015			No	1.5
174	EJECUCIÓN: Registro de estudiantes de instituciones educativas con más de 200 estudiantes costa y sierra planificado	5-Entregables Intermedios	31/08/2015	31/08/2015			No	3.0
175	EJECUCIÓN: Registro de notas por parte de docentes en las instituciones con más de 200 estudiantes costa y sierra planificado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	3.0
176	EJECUCIÓN. Hitos 2016 planificados	5-Entregables Intermedios	31/12/2016	31/12/2016			No	5.0
177	CIERRE. Proyecto finalizado 2017	5-Entregables Intermedios	31/12/2017	31/12/2017			No	10.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Supervisión Negativa no se a podido verificar los avances del proyecto en Morona Santiago de acuerdo al hito hito 170 del Registro de estudiantes	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	22/06/2015
2	APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	29/05/2015
3	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
4	Laboratorios completamente equipados	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/04/2015
5	proyecto avanza con normalidad en el Canton Chimbo	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	18/12/2014
6	No se nos proporcionó la información	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/11/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	31,596,049.72
Estimado Al Fin Del Proyecto:	22,358,643.84 **
Costo Total:	250,883,824.00
Total Devengado:	20,715,201.44
% Costo Total Devengado:	8.26 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 8.26 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	9,305,652.12	0.00	0.00	9,305,652.12
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	17,357,148.31	2,923,098.23	0.00	20,280,246.54
Ppto. Codificado	19,160,329.64	3,183,314.44	0.00	22,343,644.08
Ppto. Comprometido	644,714.81	1,280,155.80	0.00	1,924,870.61
Planeado - Codificado (2015)		-3,183,314.44		
Programado a Devengar	159,541,076.84	2,923,098.20	0.00	162,464,175.04
Ppto. Devengado	19,435,545.64	1,279,655.80	0.00	20,715,201.44
Estimado a fin de año	* 19,435,545.64	0.00	0.00	19,435,545.64
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	140,105,531.20	2,923,098.20	0.00	143,028,629.40
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 12.18 %	43.78 %	0.00 %	12.75 %
Ppto. Codificado 998	0.00	501,004.69	0.00	501,004.69
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

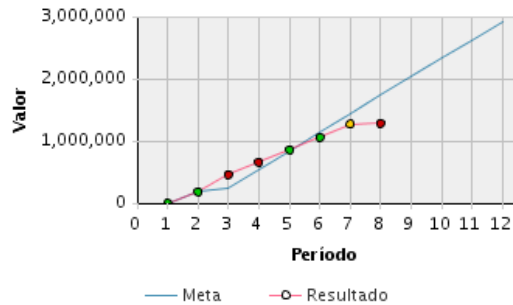

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	177,047.52	177,047.52	177,047.52	177,047.52	100.00 %		6.06 %
Mar	56,307.30	282,598.96	233,354.82	459,646.48	196.97 %		15.72 %
Abr	298,871.38	199,812.62	532,226.20	659,459.10	123.91 %		22.56 %
May	298,871.38	192,031.13	831,097.58	851,490.23	102.45 %		29.13 %
Jun	298,871.38	199,625.50	1,129,968.96	1,051,115.73	93.02 %		35.96 %
Jul	298,871.38	214,491.34	1,428,840.34	1,265,607.07	88.58 %		43.30 %
Ago	298,871.38	14,048.73	1,727,711.72	1,279,655.80	74.07 %		43.78 %
Sep	298,871.38		2,026,583.10				
Oct	298,871.38		2,325,454.48				
Nov	298,871.38		2,624,325.86				
Dic	298,772.34		2,923,098.20				
Total	2,923,098.20	1,279,655.80					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
No hay información disponible	

Objetivos Operativos Matriciales	
MINEDUC - Ministerio de Educación >Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir >Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación	
2	Incrementar el uso de la tecnología en el aula MEDIANTE la implementación de recursos didácticos digitales y la metodología de uso de tecnologías para toda la comunidad educativa

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. DICTAMEN DE PRIORIDAD DEL PROYECTO SITEC	A1.pdf	14/04/2014
2	A2. RESOLUCIÓN 001 VIABILIDAD SITEC	A2.pdf	14/04/2014
3	A3. PROYECTO SITEC APROBADO POR SENPLADES	A3.pdf	14/04/2014
4	A4. RESUMEN EJECUTIVO 2010-2011	A4.pdf	14/04/2014
5	A5. PROBLEMAS NO RESUELTOS 2010-2011	A5.pdf	14/04/2014
6	A6. RESUMEN EJECUTIVO 2012	A6.pdf	14/04/2014
7	A7. INCREMENTO PRESUPUESTARIO PARA PAGO DE ARRASTRES DEL 2012.	A7.pdf	14/04/2014
8	A8. RESUMEN EJECUTIVO 2013	A8.pdf	14/04/2014
9	A9. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL MINEDUC-CNT 2013	A9.pdf	14/04/2014
10	B1. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2013.	B1.pdf	14/04/2014
11	B2. ASOCIACIÓN HITO 60. LINEAMIENTOS PARA EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES DEL ECUADOR 2013-2016	B2.pdf	14/04/2014
12	B3. ASOCIACIÓN HITO 61. FICHA DE EVALUACIÓN DE PORTALES EDUCATIVOS.	B3.pdf	14/04/2014
13	B4. ASOCIACIÓN HITO 63. INDUCCIÓN DE USO DE TIC EN MI INUN YA (UEM-Santo Domingo)	B4.pdf	14/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	B5. ASOCIACIÓN HITO 64. ELABORACIÓN DE TDR PARA CURSO DE TIC 3.	B5.pdf	14/04/2014
15	B6. ASOCIACIÓN HITO 65. FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.	B6.pdf	14/04/2014
16	B7. ASOCIACIÓN HITO 66. TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS A LA COORDINACIÓN ZONAL 8.	B7.pdf	14/04/2014
17	B8. ASOCIACIÓN HITO 67. INFORME DE PARTICIPACIÓN EN LA II JORNADA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN.	B8.pdf	14/04/2014
18	B9. ASOCIACIÓN HITO 71. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES DE CCNN PARA 5to EGB.	B9.pdf	14/04/2014
19	C1. ASOCIACIÓN HITO 72. DISEÑO DE INTERFAZ PLATAFORMA VIRTUAL (link: virtual.educacion.gob.ec)	C1.pdf	14/04/2014
20	C2. ASOCIACIÓN HITO 73. PRESENTACIÓN DE FOROS EN LA ASAMBLEA SOBRE SOFTWARE LIBRE.	C2.pdf	14/04/2014
21	C3. ASOCIACIÓN HITO 76. CUADRO DE CERTIFICADOS DIGITALIZADOS EN LAS ATC (30-08-2013)	C3.pdf	14/04/2014
22	C4. ASOCIACIÓN HITO 80. NUEVO INTERFAZ DE USUARIO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL (link: virtual.educacion.gob.ec)	C4.pdf	14/04/2014
23	C5. ASOCIACIÓN HITO 85. INFORME DE INTERVENCIÓN DE USO DE TIC EN MI INUN YA (UEM-Santo domingo)	C5.pdf	14/04/2014
24	C6. ASOCIACIÓN HITO 86. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES EN CIENCIAS SOCIALES DE 5to EGB.	C6.pdf	14/04/2014
25	C7. ASOCIACIÓN HITO 87. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES EN CIENCIAS LENGUA DE 5to EGB.	C7.pdf	14/04/2014
26	C8. ASOCIACIÓN HITO 88. MATRIZ PARA SELECCIONAR RECURSOS DIGITALES EN MATEMÁTICAS DE 5to EGB.	C8.pdf	14/04/2014
27	C9. ASOCIACIÓN HITO 93. INFORME TECNICO PLATAFORMA DE SERVICIOS	C9.pdf	14/04/2014
28	D1. ASOCIACIÓN HITO 94. PLATAFORMA DE SERVICIO EDUCAR-ECUADOR (ANEXO 001 CONVENIO MINEDUC-CNT)	D1.pdf	14/04/2014
29	D2. ASOCIACIÓN HITO 96. CURSO VIRTUAL DE TIC I.	D2.pdf	14/04/2014
30	D3. ASOCIACIÓN HITO 97. CURSO VIRTUAL DE TIC II.	D3.pdf	14/04/2014
31	D4. ASOCIACIÓN HITO 98. CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES.	D4.pdf	14/04/2014
32	D5. ASOCIACIÓN HITO 99. GUÍA DIDÁCTICA DE CONTENIDOS PARA DICTAR CURSOS EN LAS ATC.	D5.pdf	14/04/2014
33	D6. ASOCIACIÓN HITO 100. DOCENTES CAPACITADOS EN TIC 1 EN COTACACHI.	D6.pdf	14/04/2014
34	D7. ASOCIACIÓN HITO 101. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSO TIC 1 EN SANTO DOMINGO.	D7.pdf	14/04/2014
35	D8. ASOCIACIÓN HITO 102. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSO TIC 1 EN SANGOLQUI.	D8.pdf	14/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
36	D9. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2010. (27 00 011)	D9.pdf	14/04/2014
37	E1. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2011	E1.pdf	14/04/2014
38	E2. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2012	E2.pdf	14/04/2014
39	E3. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO 2013	E3.pdf	14/04/2014
40	E4. ASOCIACIÓN HITO 104. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL "virtual.educacion.gob.ec".	E4.pdf	14/04/2014
41	E5. ASOCIACIÓN HITO 105. ENCUENTRO DE INDUCCIÓN Y DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS EDUCAR-ECUADOR.	E5.pdf	14/04/2014
42	E6. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO ENERO-2014	E6.pdf	14/04/2014
43	E7. ASOCIACIÓN HITO 106. CAPACITACIÓN DE 49 DOCENTES EN CURSO DE TIC 1 EN LA UEM BICENTENARIO FISCAL.	E7.pdf	14/04/2014
44	E8. ASOCIACIÓN HITO 107. CAPACITACIÓN DE 70 DOCENTES EN CURSO DE TIC 1 EN LA UEM BICENTENARIO MUNICIPAL.	E8.pdf	14/04/2014
45	E9. ASOCIACIÓN HITO 108. LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE DE CONOCIMIENTOS TIC A DOCENTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO.	E9.pdf	14/04/2014
46	F1. ASOCIACIÓN HITO 109. CAPACITACIÓN VIRTUAL A 1183 DOCENTES DE 15 UNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA PICHINCHA.	F1.pdf	14/04/2014
47	F2. ASOCIACIÓN HITO 110. LEVANTAMIENTO LÍNEA BASE DE CONOCIMIENTOS TIC A DOCENTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA HIDROBO.	F2.pdf	14/04/2014
48	F3. ASOCIACIÓN HITO 111. CREACIÓN DE MAPEOS DE CIENCIAS SOCIALES Y LENGUA PARA 8vo AÑO DE EGB.	F3.pdf	14/04/2014
49	F4. ASOCIACIÓN HITO 112. CREACIÓN DE MENÚS (11 de matemáticas, 11 de lengua, 6 de ciencias sociales, 6 de ciencias naturales.) EN PLATAFORMA EDUCARECUADOR.	F4.pdf	14/04/2014
50	F5. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO FEBRERO-2014 (27 00 011)	F5.pdf	14/04/2014
51	F6. ASOCIACIÓN HITO 113. Docentes en proceso de capacitación en cursos TIC 1 a través de la Plataforma EducarEcuador en un total de 41 Instituciones Educativas.	F6.pdf	14/04/2014
52	F7. ASOCIACIÓN HITO 114. CERTIFICACIÓN DOCENTES SIPROFE PARA REPLICAR CONOCIMIENTOS EN ATC.	F7.pdf	14/04/2014
53	F8. ASOCIACIÓN HITO 115. CLASIFICACIÓN DE RDD POR DESTREZAS, AREAS Y AÑOS DE EGB Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA EDUCARECUADOR.	F8.pdf	14/04/2014
54	F9. ASOCIACIÓN HITO 116. MANUAL PARA USO DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS.	F9.pdf	14/04/2014
55	G1. ASOCIACIÓN HITO 117. GUÍA METODOLÓGICA DE VINCULACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN EN AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS.	G1.pdf	14/04/2014
56	G2. ASOCIACIÓN HITO 118. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SENSIBILIZADAS PARA LA CREACIÓN DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA.	G2.pdf	14/04/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
57	G3. ASOCIACIÓN HITO 119. CREACIÓN DE CLAVES Y CONTRASEÑAS A 3022 DOCENTES-USUARIOS EN PLATAFORMA, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR.	G3.pdf	14/04/2014
58	G4. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO MARZO-2014 (27 00 011)	G4.pdf	14/04/2014
59	G5. ASOCIACIÓN HITO 120. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR.	G5.pdf	14/04/2014
60	G6. ASOCIACIÓN HITO 121. DOCENTES QUE RECIBIERON KIT TECNOLÓGICO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR ENERO-ABRIL.	G6.pdf	30/04/2014
61	G7. ASOCIACIÓN HITO 122. DOCENTES CAPACITADOS EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA Educar-Ecuador EN UN TOTAL DE 19 INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	G7.pdf	30/04/2014
62	G8. ASOCIACIÓN HITO 123. MAPEO DE RDD PARA 10 EGB EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS.	G8.pdf	05/05/2014
63	G9. ASOCIACIÓN HITO 124. CREACIÓN DE CLAVES Y CONTRASEÑAS A 765 USUARIOS EN PLATAFORMA, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR.	G9.pdf	05/05/2014
64	H1. ASOCIACIÓN HITO 125. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LA ZONA 3 E INICIO DE DOS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN LAS UEM PENIPE Y GUANO	H1.pdf	05/05/2014
65	H2. ASOCIACIÓN HITO 126. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE 1958 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS TIC 1.	H2.pdf	04/06/2014
66	H3. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO ABRIL-2014 (27 00 011)	H3.pdf	05/05/2014
67	H4. ASOCIACIÓN ASUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 004-MINEDUC-2011. (DOCUMENTOS DE RESPALDO)	H4.pdf	05/05/2014
68	H5. INFORME TÉCNICO DE INDICADOR DE NÚMERO DE PERSONAS ALFABETIZADAS EN CURSOS TIC A TRAVÉS DE AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS ATC.	H5.pdf	06/05/2014
69	H6. ASOCIACIÓN HITO 127. TDR E INFORME TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE UN RECURSO DIGITAL DEL IDIOMA SHUAR APROBADO.	H6.pdf	29/05/2014
70	H7. ASOCIACIÓN HITO 128. 1738 PERSONAS ALFABETIZADAS EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE MAYO.	H7.pdf	04/06/2014
71	H8. ASOCIACIÓN HITO 129. DOCENTES QUE RECIBIERON KIT TECNOLÓGICO PARA EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCAR-ECUADOR EN MAYO.	H8.pdf	30/05/2014
72	H9. ASOCIACIÓN HITO 130. Mapeo para 4 EGB de Ciencias Naturales y Mapeo de 10 EGB para Sociales elaborado.	H9.pdf	30/05/2014
73	I1. ASOCIACIÓN HITO 131. Segunda etapa de la comunidad de aprendizaje iniciada.	I1.pdf	30/05/2014
74	I2. ASOCIACIÓN HITO 132. Usuarios: 585 DOCENTES CON CLAVES Y CONTRASEÑAS PARA UTILIZACIÓN DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR.	I2.pdf	04/06/2014
75	I3. ASOCIACIÓN HITO 133. MAPEO PARA 4 EGB DE LAS 3 ÁREAS Y MAPEO PARA 10 EGB PARA LENGUA Y LITERATURA.	I3.pdf	02/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
76	14. ASOCIACIÓN HITO 134. AVANZADA EN CAPACITACIÓN PALN LECTOR.	I4.pdf	02/07/2014
77	15. ASOCIACIÓN HITO 135. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LA ZONA 9 E INICIO DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LA UNIDAD EDUCATIVA RÉPLICA 24 DE MAYO.	I5.pdf	02/07/2014
78	16. ASOCIACIÓN HITO 136. MAPEO PARA 3 EGB PARA ENTORNO NATURAL Y SOCIAL.	I6.pdf	05/08/2014
79	17. ASOCIACIÓN HITO 137. 1851 PERSONAS ALFABETIZADAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS TIC 1 A TRAVÉS DE ATC EN EL MES DE JUNIO.	I7.pdf	02/07/2014
80	18. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO JUNIO-2014 (27 00 011)	I8.pdf	02/07/2014
81	19. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO MAYO-2014 (27 00 011)	I9.pdf	03/09/2014
82	J1. ASOCIACIÓN CIERRE PROBLEMA INCUMPLIMIENTO CONTRATO 004-MINEDUC-2011	J1.pdf	15/07/2014
83	J2. ASOCIACIÓN PROBLEMA FALTA DE APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SITEC AL 2017.	J2.pdf	15/07/2014
84	J3. ASOCIACIÓN HITO 138. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LAS ZONAS 1 Y 2 E INICIO DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE AL MENOS EN CADA ZONA.	J3.pdf	05/08/2014
85	J4. ASOCIACIÓN HITO 139. MAPEO PARA 2 EGB PARA LAS TRES ÁREAS.	J4.pdf	05/08/2014
86	J5. ASOCIACIÓN HITO 140. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, DOCENTES PREPARADOS EN EL CURSO FORMADORES DE FORMADORES.	J5.pdf	05/08/2014
87	J6. ASOCIACIÓN HITO 141. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE 4.539 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE JULIO.	J6.pdf	05/08/2014
88	J7. ASOCIACIÓN HITO 142. USUARIOS: 819 DOCENTES CON CLAVES Y CONTRASEÑAS PARA UTILIZACIÓN DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR, ACCESO A TICS Y PLAN LECTOR DE LA ETAPA "SEMILLERO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LÍNEA".	J7.pdf	05/08/2014
89	J8. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO JULIO-2014 (27 00 011)	J8.pdf	05/08/2014
90	J9. ASOCIACIÓN PROLEMA REVISIÓN TECHO PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO "SITEC".	J9.pdf	05/08/2014
91	K1. ASOCIACIÓN HITO 143. ANÁLISIS DE RECURSOS PARA 1 DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO.	K1.pdf	04/09/2014
92	K2. ASOCIACIÓN HITO 144. SOCIALIZACIÓN A DOCENTES DE 9 INSTITUCIONES EDUCATIVAS REFERENTES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA NEARPOD PARA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL AULA	K2.pdf	04/09/2014
93	K3. ASOCIACIÓN HITO 145. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE 3.704 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE AGOSTO.	K3.pdf	04/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
94	K4. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO AGOSTO-2014 (27 00 011)	K4.pdf	04/09/2014
95	K5. ASOCIACIÓN HITO 146. TALLER DE USO DE LA PLATAFORMA NEARPOD PARA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL AULA DIRIGIDO A 40 DOCENTES ENTRE TÉCNICOS TERRITORIALES Y PERSONAL DE PLANTA CENTRAL.	K5.pdf	01/10/2014
96	K6. ASOCIACIÓN HITO 147. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DEL PCEL EN LAS ZONAS 6 Y 7 E INICIO DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE AL MENOS EN CADA ZONA FINALIZADA.	K6.pdf	02/10/2014
97	K7. ASOCIACIÓN HITO 148. INDUCCIÓN 1.193 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	K7.pdf	02/10/2014
98	K8. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO SEPTIEMBRE-2014 (27 00 011)	K8.pdf	01/10/2014
99	K9. INFORME JUSTIFICATIVO DEL INDICADOR DE NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO A LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR.	K9.pdf	02/10/2014
100	L1. ASOCIACIÓN HITO 149. ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS EN EL AULA.	L1.pdf	05/11/2014
101	L2. ASOCIACIÓN HITO 150. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA EXTERNA PARA EL ACCESO A RECURSOS DIGITALES DE LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR.	L2.pdf	05/11/2014
102	L3. ASOCIACIÓN HITO 151. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA INTERNA PARA EL ACCESO A RECURSOS DIGITALES DE LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR	L3.pdf	05/11/2014
103	L4. ASOCIACIÓN HITO 152.- INDUCCIÓN DE 2361 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE OCTUBRE.	L4.pdf	05/11/2014
104	L5. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO OCTUBRE-2014 (27 00 011)	L5.pdf	05/11/2014
105	L6. ASOCIACIÓN HITO 153. DOCUMENTO DE REFORMULACIÓN DEL PROYECTO HASTA EL 2017 PARA LA APROBACIÓN DE LAS AUTORIDADES ELABORADO.	L6.pdf	01/12/2014
106	L7. ASOCIACIÓN HITO 154. INDUCCIÓN DE 2322 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS ATC EN EL MES DE NOVIEMBRE.	L7.pdf	01/12/2014
107	L8. ASOCIACIÓN HITO 155. ANÁLISIS DE RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA TABLETAS EDUCATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y QUINTO DE BÁSICA ELABORADO.	L8.pdf	02/12/2014
108	L9. ASOCIACIÓN PERFIL ECONÓMICO NOVIEMBRE-2014 (27 00 011)	L9.pdf	02/12/2014
109	M1. ASOCIACIÓN HITO 156. INDUCCIÓN DE 3032 PERSONAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN CURSOS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL BÁSICA Y AVANZADA A TRAVÉS DE LAS AULAS	N1.pdf	31/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
	TECNOLÓGICAS COMUNITARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE.		
110	M2. ASOCIACIÓN HITO 157. ANÁLISIS DE 88 RECURSOS PARA EGB DE CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LENGUA Y LITERATURA, ESTUDIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN INICIAL.	N2.pdf	31/12/2014
111	M3 ASOCIACION HITO 158: DOCUMENTO PARA REFORMULACION DEL PROYETO SITEC	N3.pdf	05/01/2015
112	M4 ASOCIACION HITO 159: DICTAMEN SENPLADES GESTIONADO	N4.pdf	05/01/2015
113	M5 ASOCIACION PERFIL ECONOMICO DICEIMBRE 2014	N5.pdf	05/01/2015
114	M6. ASOCIADO AL HITO 160. DOCUMENTO REFORMULACIÓN PROYECTO SITEC	N.6.pdf	06/03/2015
115	M7. ASOCIADO AL HITO 161. DISTRIBUCIÓN PERSONAL ZONAS Y DISTRITOS SITEC	N.7.pdf	06/03/2015
116	M8. ASOCIADO AL HITO 162. PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PROYECTO SITEC	N.8.pdf	06/03/2015
117	M9. ASOCIADO AL HITO 163. PROGRAMACIÓN PAI 2015	N.9.xls	06/03/2015
118	N1. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ZONAS Y DISTRITOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	N.10.pdf	06/03/2015
119	N2 PAI del Proyecto SITEC al 30 Abril	PAI_SITEC_31-04-2015.xlsx	11/05/2015

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	EDUCAR ECUADOR http://www.educarecuador.gob.ec
2	Plataforma virtual Ministerio de Educación. http://virtual.educacion.gob.ec/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Bernal Párraga, Augusto Paolo	Analista SITEC	Analista SITEC	augusto.bernal@educacion.gob.ec
Maroto Banegas, Carlos Alberto	Analista SITEC	Analista SITEC	carlos.maroto@educacion.gob.ec
Quintanilla González, Edison Omar	Especialista SITEC	Especialista SITEC	edison.quintanilla@educacion.gob.ec
Tello Santillan, Christian Javier	Líder del Proyecto (Encargado)	Asesor de la Coordinación General de Gestión Estratégica	christian.tello@educacion.gob.ec
